SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Programa de la Red Solidaria (PRS)

Informe No. 0415-003-2026

Tegucigalpa, Octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 5
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 6
D. PRINCIPALES PROYECTOS 7
D.1 APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO 7
D.1.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 9
D.1.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 9
D.2 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LAS COMUNIDADES DE ATLANTIDA EN HONDURAS/ BM -TFOC3767 10
D.2.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 11
D.2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 12
D.2.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 12
D.2.4 Problemas que Afectan la Ejecución del Programas y sus Respectivas Acciones 12
D.3 PROGRAMA BONO ALIVIO A HOGARES VULNERABLES AFECTADOS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO/ BCIE 2282 13
D.4 PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL / BIP 23593 – Préstamo BID 4619-BL-HO 13
D.4.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 15
D.4.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 15
D.5 MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO: PROYECTO JOVEN / BID 4449/BL-HO 16
D.5.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 16
D.5.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 17
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 17
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 17
G. CONCLUSIONES 18
H. RECOMENDACIONES 19
ANEXO 1 20
ANEXO 2 22

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de la Red Solidaria (PRS), creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 como un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, tiene como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema mediante la ejecución de programas y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables, focalizadas a través de los sistemas de información social y las herramientas técnicas disponibles del Estado.

Asimismo, el PRS contempló el diseño, estructuración, ejecución, administración y supervisión de proyectos productivos y sociales, incluyendo programas de becas dirigidos a jóvenes de educación primaria, media y universitaria, con el propósito de fortalecer las oportunidades de desarrollo e inclusión social de la población beneficiaria; designando que los proyectos que se encontraban bajo la responsabilidad de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), se ejecutarán a través del Programade Red Solidaria.

Además, mediante Decreto PCM-08-2022 se detallan los objetivos y actividades que el programa realizaría, así como sus lineamientos y funciones.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**640,364,921**
Inversión Productiva	622,860,221
Formación Bruta de Capital	17,504,700
Presupuesto Vigente	**725,359,430**
Inversión Productiva	725,359,430
Formación Bruta de Capital	0
Ejecutado III Trimestre	**45,562,393**
Inversión Productiva	45,562,393
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**6.3%**
Ejecutado Anual	**125,714,022**
Inversión Productiva	125,714,022
Formación Bruta de Capital	0
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**17.3%**
Compromiso Aprobado	**191,262,582**
Inversión Productiva	191,262,582
Formación Bruta de Capital	0
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**26.4%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

El 25 de febrero de 2026 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-04-2026, mediante el cual se suprime el Programa de la Red Solidaria, junto con otras entidades del Estado. Dicho decreto faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), en representación del Gobierno de la República de Honduras, para realizar las gestiones administrativas y legales necesarias ante los organismos financieros internacionales, con el propósito de formalizar el cambio de Unidad u Organismo Ejecutor de los recursos disponibles de la cartera de financiamiento vigente, trasladando dicha responsabilidad del Programa de la Red Solidaria a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución de los programas y proyectos vigentes, el Decreto establece que las instituciones suprimidas mantendrán temporalmente su condición de organismos ejecutores, debiendo continuar con las actividades operativas y administrativas hasta que la transferencia de los programas y proyectos se realice de manera ordenada, eficiente y conforme a derecho. Para ello, se dispone un período máximo de transición de seis (6) meses a partir de la entrada

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

en vigor del Decreto, respetando los objetivos, alcances y condiciones establecidos en los convenios, contratos de crédito y donaciones internacionales.

Posteriormente, el 25 de mayo de 2026 se emitió el Decreto Ejecutivo No. PCM-14-2026, cuyo Artículo 20 regula el régimen transitorio del Programa de la Red Solidaria. Esta disposición establece que, durante el período de transición de seis (6) meses, el Programa únicamente podrá realizar las actuaciones estrictamente indispensables para la ejecución y cierre de proyectos financiados con recursos externos, el cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas, la presentación de información y reportes requeridos por los organismos financiadores, así como la transferencia progresiva, ordenada y documentada de funciones, expedientes, recursos, personal, bienes y obligaciones hacia SEDESOL. Finalizado dicho período, todas las funciones sustantivas y operativas serán asumidas por esta Secretaría.

En el tercer trimestre del 2026, el Programa de la Red Solidaria (PRS) contó con un presupuesto aprobado para la inversión pública de L640.4 millones; el presupuesto vigente al 30 de septiembre de 2026 para la inversión pública es de L725.4 millones del cual el 100% corresponde a inversión productiva y tomando en cuenta la supresión ya no tiene asignado presupuesto para la formación bruta de capital fijo. La ejecución presupuestaria en el tercer trimestre en cifras asciende a L45.6 millones representando el 6.3% del Presupuesto Vigente; además, la ejecución presupuestaria total al 30 de septiembre de 2026 asciende a L125.7 millones lo cual representa 17.3% sobre el presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.

La ejecución productiva se realizó mediante cinco proyectos de inversión pública tales como:

1. Apoyo al Sistema Integral de Protección Social
2. Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático
3. Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras
4. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven;
5. Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal

Cabe resaltar que los proyectos que los siguientes proyectos, aunque tiene presupuesto vigente, han culminado su ejecución física y financiera, por lo tanto, en la actualidad solamente están pendientes de la entrega de los informes y fichas de cierre ante la Secretaría de Finanzas y los informes de auditoría correspondientes tanto a la SEFIN como al organismo financiador (Banco Mundial):

1. El Proyecto de Integración de la Protección Social
2. Adicional al Proyecto de Integración financiados;

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN


B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Al tercer trimestre de 2026, el financiamiento de la inversión del Programa de la Red Solidaria (PRS) proviene principalmente de Crédito Externo (Fuente 21), que representa el 94.3% del presupuesto vigente, equivalente a L684.0 millones, de los cuales se han ejecutado L121.0 millones.

Por su parte, las Donaciones Externas (Fuente 22) constituyen el 5.7% del presupuesto vigente, con una asignación de L41.4 millones y una ejecución de L4.7 millones. No se registran recursos asignados ni ejecutados con Fondos Nacionales (Fuente 11).

Esta estructura evidencia una alta dependencia del financiamiento externo para la ejecución de la inversión pública del Programa durante el período analizado, esto se debe principalmente a la supresión de la PRS y transición de los proyectos hacía SEDESOL.

Gráfico No. 01
PRS: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

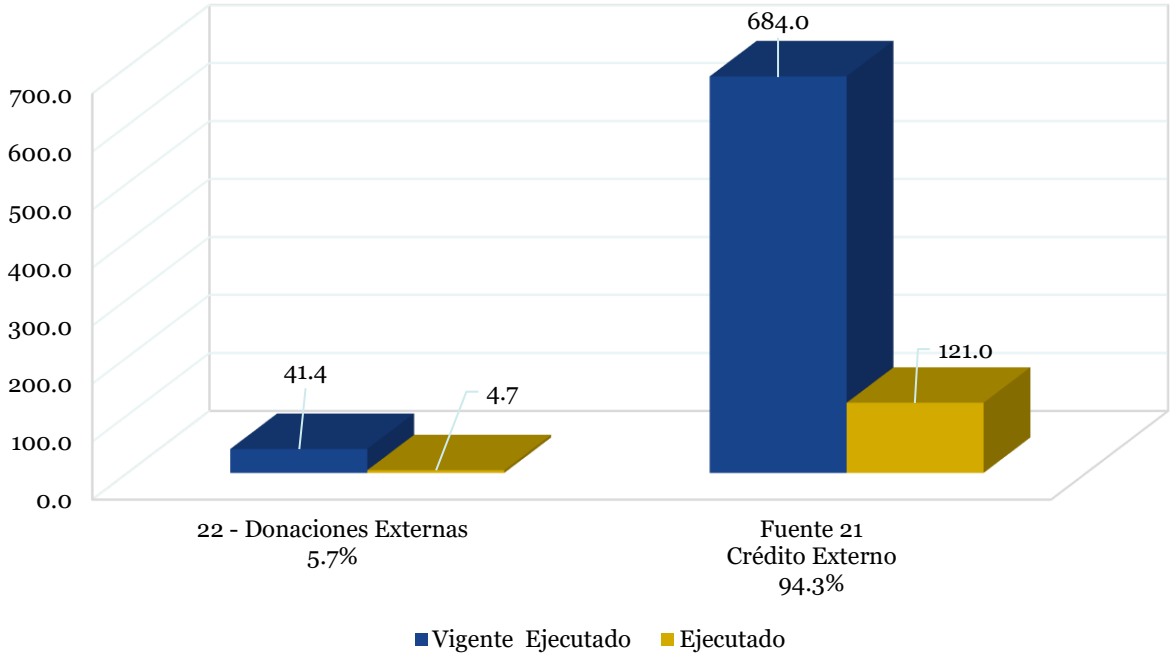

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN


C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

En el Gráfico No. 02 se muestra la ejecución de la inversión pública del Programa de la Red Solidaria (PRS) al 30 de septiembre muestra una tendencia de mejora en la capacidad de ejecución entre 2022 y 2025. En 2022, la PRS no registró ejecución presupuestaria, mientras que en 2023 se ejecutaron L526.9 millones, equivalentes al 15.2% del presupuesto vigente; mientras que en 2024 la ejecución disminuyó a L382.8 millones (13.5%), y en 2025 alcanzó su mejor desempeño, con L1,345.3 millones, representando el 45.1% del presupuesto vigente.

Al 30 de septiembre de 2026, el presupuesto vigente asciende a L725.4 millones, con una ejecución de L125.7 millones (17.3%), porcentaje que, aunque inferior al registrado en el mismo período de 2025, refleja limitaciones que fueron provocadas por agentes externos tal como el contexto de transición institucional, los contratos que trascienden periodo de Gobierno que fueron aprobados por el Congreso Nacional en el segundo semestre y los ajustes administrativos derivados del cambio de organismo ejecutor.

Gráfico No. 02

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0415 - Programa de la Red Solidaria
Cifras en millones de Lempiras

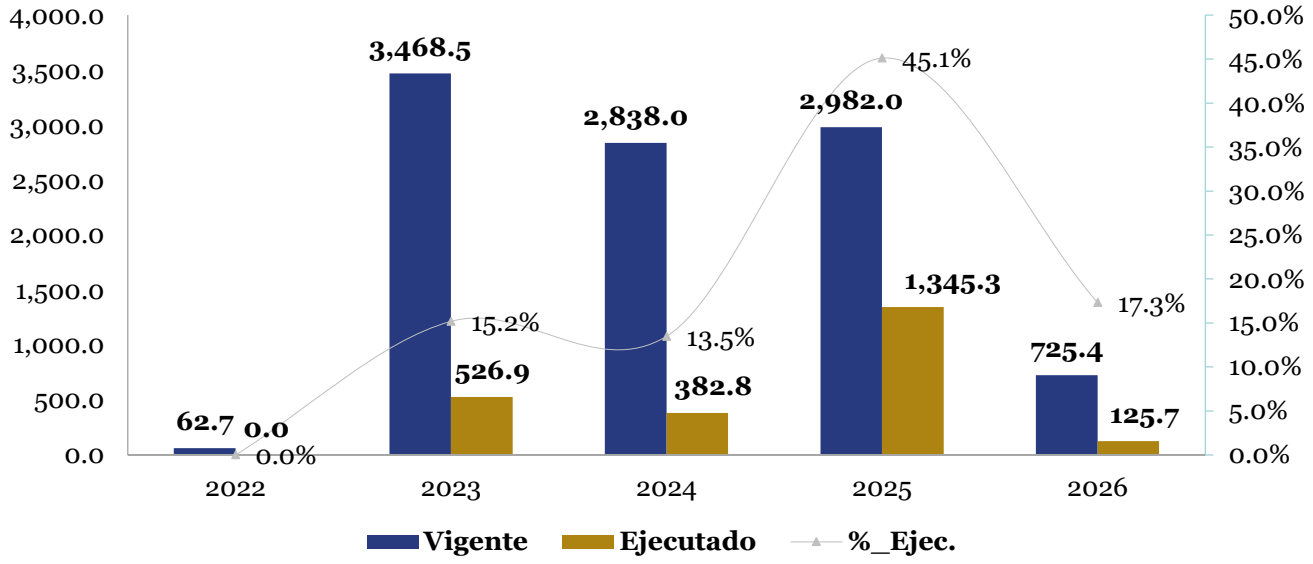

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de la Red Solidaria (PRS), presenta en su presupuesto vigente ocho proyectos de inversión pública, todos ejecutados con fondos externos (crédito y donación).

1. Apoyo al Sistema Integral de Protección Social financiado con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 5008/BL-HO;
2. El Proyecto de Integración de la Protección Social 6401-HN
3. Adicional al Proyecto de Integración financiados con crédito externo del Banco Mundial (BM);
4. Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático, financiado mediante contrato de préstamo BCIE 2282, suscrito con el Banco Interamericano de Integración Económica.
5. Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras, financiado mediante una donación del Banco Mundial;
6. Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven; financiado por el BID
7. Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal (BID).
8. Proyecto de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus.

De los cuales tres se encuentran ya finalizados y en proceso de presentación de informes finales; mientras que el **Proyecto Joven,** realizó ya el Taller de Cierre y presentó ante la SEFIN el Informe y Ficha de Cierre.

A continuación, se presentan sus avances, metas físicas y financieras, así como los principales procesos de adquisición, con base en la información reportada por la Unidad Ejecutora del PRS y de acuerdo con el presupuesto vigente:

D.1 APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (IV) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza.

Este proyecto dio inicio en 2020, al cual se le otorgó ampliación de plazo al 30 de octubre de 2026 como nueva fecha de Plazo de Último Desembolso y se mantiene el 31 de diciembre de 2026 como culminación del cierre con la presentación de Informe Final Auditado.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

El proyecto es co-ejecutado con la Secretaría de Salud y de los cuatro componentes el Programa de la Red Solidaria ejecuta tres de ellos:

- Componente 1. Transferencias monetarias Condicionadas
- Componente 2. Fortalecimiento Operativo e Institucional del Organismo Ejecutor
- Componente 4. Ordenamiento del Piso de Protección Social

Debido a que el presupuesto fue aprobado hasta el mes de abril del presente año, la ejecución de las actividades programadas se retrasó, afectando el cumplimiento oportuno de los productos previstos. Durante el período reportado, los **tres entregables** del proyecto BID 5008 presentan 0 % de avance físico, debido a que su ejecución está prevista para el cuarto trimestre de 2026.

- Los contratos con las ONG y la firma evaluadora ya fueron suscritos, y se prevé realizar las transferencias pendientes durante el próximo trimestre.
- La ejecución financiera registrada corresponde principalmente a gastos operativos y asistencias técnicas del proyecto.D.1.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Durante el tercer trimestre de 2026, **los indicadores del proyecto BID 5008/BL-HO no registran avances físicos reportados**, dado que el cumplimiento de las metas está programado para el cuarto trimestre del año; entre los principales resultados esperados se encuentran:

- La entrega de incentivos de capital semilla a 1,000 hogares, la atención educativa de estudiantes mediante modalidades alternativas,
- El equipamiento de centros educativos,
- El fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento educativo y la atención de jóvenes emprendedores.

Asimismo, se prevé certificar docentes en enseñanza de lectura y escritura en 500 centros educativos; sin embargo, el cumplimiento de estas metas dependerá del avance de las intervenciones territoriales ejecutadas por las ONG y del seguimiento oportuno a las obligaciones contractuales. Los principales avances físicos programados al 30 de septiembre 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/BL-HO	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1000	0	0%	0	0	N/A
	Reporte generado de los participantes del PRS que	Reporte	1	0	0%	0	0	N/A

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador.							
	Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS.	Contrato	1	0	0%	1	0	0%
	Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS.	Contrato	1	1	100%	1	1	100%

D.1.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Apoyo Integral de Protección Social:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	BID 5008/BL-HO	US$	54,200,000	13/8/2020
		Lempiras	1,448,131,860	24/09/2026 31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	61,067,896	255,413,665	11,975,191.9	4.7%
Acumulado 2026	61,067,896	255,413,665	29,649,866.0	11.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,448,131,860	1,448,131,860.0	1,245,937,579.5	86.0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026: L26.7183 por US$1.00

D.1.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

La Unidad ejecutora presenta la siguiente información sobre las adquisiciones en el tercer trimestre:

Durante el período reportado, se registra un total de 178 procesos de contratación, orientados al fortalecimiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), la gestión territorial y el desarrollo de capacidades técnicas para la implementación del proyecto.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

De estos procesos, se identifican 131 contratos activos de consultoría y personal técnico, incluyendo asesores, especialistas, coordinadores, gestores sociales y profesionales vinculados al desarrollo de sistemas informáticos. Asimismo, se reportan 45 procesos pendientes de formalización mediante firma de contrato, correspondientes principalmente a coordinadores departamentales, oficiales de atención al participante y personal de apoyo logístico. Adicionalmente, se encuentra activo el contrato con RED ITC / PRS, por un monto de L 9,459,094.00, destinado al fortalecimiento de las capacidades y oportunidades de adolescentes y jóvenes vinculados a los centros educativos participantes.

En términos de gestión, estas contrataciones buscan fortalecer la capacidad operativa del proyecto y facilitar la implementación de sus intervenciones en los territorios. No obstante, se recomienda dar seguimiento prioritario a los procesos pendientes de firma, verificar la disponibilidad presupuestaria y asegurar que las contrataciones se traduzcan en productos y resultados verificables, conforme a los plazos y objetivos establecidos.

D.2 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LAS COMUNIDADES DE ATLANTIDA EN HONDURAS/ BM -TFOC3767

El Objetivo del Proyecto es mejorar el desarrollo infantil temprano (DIT) de los menores de cinco años mediante el fortalecimiento de determinados servicios de DIT y la promoción de prácticas positivas de cuidado dirigidas a los hogares más pobres en todos los municipios del departamento de Atlántida.

El proyecto inició el 01 de julio de 2024 y presenta fecha de cierre el 30 de junio de 2027 y comprende tres componentes:

- Componente 1: Implementación del Plan Crecer en el Departamento de Atlántida
- Componente 2: Fortalecimiento de la Capacidad Local para Brindar Servicios Integrados de DIT
- Componente 3: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto y Diseminación de Conocimientos

Sin embargo, al proyecto se le ha autorizado cambio de cabecera, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 013-2026, por lo que se prorrogó al 31 de diciembre de 2026 el plazo para realizar la transición de cambio de organismo ejecutor del proyecto, siendo la nueva cabecera y unidad ejecutora la Secretaría de Salud.

Durante el periodo reportado, presentan los avances de los indicadores de desarrollo del proyecto y de los indicadores intermedios. El cumplimiento de las metas se ha visto limitado debido a la pausa en la implementación del proyecto, como consecuencia de la decisión de las autoridades de trasladarlo a la Secretaría de Salud; en este contexto, se procedió a la cancelación del personal de campo y actualmente se desarrollan las actividades administrativas y operativas necesarias para garantizar un cierre ordenado y facilitar el proceso de traslado, conforme a lo establecido en el PCM-014-2026; esta situación ha incidido en el avance de los indicadores, ya que varias de las actividades previstas no han podido continuar con normalidad.

No obstante, se registran avances puntuales, entre los que destacan:

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- El cumplimiento de la meta de cobertura de vacunación completa en niños menores de cinco años, que alcanzó el 74.4 % frente a una meta del 70 %;
- La participación de madres en actividades de estimulación infantil, con un avance del 40.3 % frente a una meta del 80 %; y
- La elaboración de planes de trabajo por parte de seis juntas municipales, de una meta de ocho.

En consecuencia, el progreso de los indicadores restantes depende de las decisiones institucionales relacionadas con el traslado y de las condiciones que se establezcan para la continuidad de las intervenciones en el marco de la nueva entidad ejecutora.

D.2.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Los principales avances físicos de la programación al 30 de septiembre de 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras (TFOC 3767)	Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF 0C3767	Kits entregados	500	0	0%	0	0	N/A
	Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida.	Obra	2	0	0%	0	0	N/A
	Número de mujeres embarazadas que reciben servicios de salud y nutrición del Plan Crecer (numero)	Número	1000	165	17%	99	99	N/A

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

Considerando el Decreto PCM 013-2026, la Secretaría de Salud como nuevo organismo ejecutor quedará encargada a partir de la suscripción de las modificaciones al contrato de financiamiento. El Decreto también indica que deberá realizarse el traspaso de archivos físicos y digitales, suministros y bienes materiales, los bienes muebles e inmuebles y cualquier otra que sea necesaria para realizar todas aquellas operaciones que permitan el traspaso de atribuciones y competencia de los programas y proyectos, así como su cierre en los casos que corresponda.

Durante el periodo reportado, no se realizaron las visitas de supervisión a las comunidades de Atlántida y a la Región Sanitaria de Atlántida, por la restricción en el uso de los recursos del proyecto por parte de las autoridades de SEDESOL.

D.2.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Programa de Desarrollo Infantil:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlántida en Honduras	BM -TFOC3767	US$	2,759,789	1/7/2024
		Lempiras	73,736,870	30/6/2027
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	41,357,923	41,357,923	1,836,720.0	4.4%
Acumulado 2026	41,357,923	41,357,923	4,675,317.5	11.3%
Acumulado Vida del Proyecto *	73,736,870	73,736,870	4,787,948.5	6.5%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026: L26.7183 por US$1.00

D.2.3 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Con recursos de la operación TFOC3767, en el periodo reportado por la transición del proyecto no se cuenta con nuevos contratos suscritos.

D.2.4 Problemas que Afectan la Ejecución del Programas y sus Respectivas Acciones

La Unidad Ejecutora reporta que la constante necesidad de realizar múltiples ajustes a los planes operativos anuales refleja una debilidad en la planificación inicial y genera incertidumbre en la ejecución de las actividades. Estos cambios frecuentes afectan la coherencia del cronograma, incrementan los costos administrativos y dificultan la evaluación objetiva del cumplimiento de metas. Además, comprometen la credibilidad institucional frente a los actores externos y socios estratégicos.

La tardanza en la reestructuración organizacional de la institución ha limitado la capacidad de respuesta frente a nuevas demandas y prioridades. La falta de definición clara de funciones y responsabilidades retrasa la toma de decisiones y genera duplicidad de esfuerzos. Este escenario debilita la eficiencia operativa y afecta la coordinación interdepartamental, reduciendo el impacto de las intervenciones.

La tardanza en la formalización del convenio de cooperación con la Secretaría de Salud ha generado retrasos en la ejecución de actividades conjuntas y en la movilización de recursos. La falta de un marco legal y administrativo vigente dificulta la coordinación interinstitucional y la definición de compromisos claros. Esta demora afecta la oportunidad de las intervenciones y debilita la confianza de los socios estratégicos en la gestión institucional.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.3 PROGRAMA BONO ALIVIO A HOGARES VULNERABLES AFECTADOS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO/ BCIE 2282

El Proyecto tiene como objetivo: (i) apoyar el mantenimiento de niveles mínimos de ingreso de las personas afectadas por la pandemia de la COVID-19 y por los huracanes ETA e IOTA durante el período de recuperación; y (ii) preservar el capital humano de la población impactada por la crisis sanitaria. Dio inicio el 12 de noviembre de 2021 y, como resultado de las ampliaciones de plazo autorizadas por la Secretaría de Finanzas y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), su fecha de cierre fue establecida para el 24 de agosto de 2026.

Durante el tercer trimestre de 2026, el Programa se concentró en el componente de Gastos de Transacción y Administración, realizando el pago de la firma auditora. En términos físicos, se completó el 100 % de la meta correspondiente a la elaboración del informe de gestión operativa, administrativa y financiera del proyecto, mientras que la ejecución presupuestaria asociada alcanzó el 89 %.

Cabe señalar que el crédito culminó sus operaciones el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, durante 2026 fue necesario habilitar estructuras presupuestarias en el SIAFI para realizar el pago pendiente de la firma auditora, relacionado con la entrega de bonos efectuada en 2025; por esta razón, los indicadores de resultados no presentan avances durante el trimestre reportado, dado que las actividades sustantivas de atención a los hogares beneficiarios ya habían concluido y las gestiones actuales corresponden al cierre administrativo y financiero del proyecto.

D.4 PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL / BIP 23593 – Préstamo BID 4619-BL-HO

El Proyecto tiene como objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal en los municipios con mayores niveles de pobreza del país y en los hospitales priorizados, mediante el fortalecimiento de la calidad, la gestión y la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

El proyecto inició el 10 de julio de 2019 y tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2026. No obstante, debe considerarse lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 14-2026, el cual fija el 25 de noviembre de 2026 como fecha límite para la ejecución de actividades a través del Programa de la Red Solidaria, en el marco del proceso de supresión de dicho programa.

A continuación, se presentan los avances por componentes reportados por la Unidad Ejecutora del Proyecto:

- **Componente I: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos-neonatales, priorizado a municipios con incidencia de muertes materno-neonatales.**
  Las actividades de este componente se desarrollaron y completaron en el 2024.

- **Componente II: Mejoramiento del Equipamiento e Infraestructura de los Servicios de Salud**

  Según el informe de la Unidad Ejecutora:

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Se encuentra finalizada la construcción de la sala neonatal del Hospital Escuela de Tegucigalpa, tiene un avance físico de obras del 100%, un avance financiero de 75.4% y una inversión aproximada de L128.0 millones; cabe resaltar, que se excluyó la actividad de reforzamiento de 12 columnas del nivel 2 del Hospital. En proceso de formalización la contratación directa para la finalización de esta obra y su supervisión.
- En el marco, de la notificación por parte del banco de gastos no elegibles al contrato PRS-4619-104-2023 suscrito para la construcción del Hospital de Occidente, debido principalmente a que la obra fue abandonada por el contratista; se ha gestionado la identificación de gastos compensables realizado por el gobierno en los hospitales intervenidos por el programa, lográndose identificar la compra de equipo médico con fondos nacionales para los hospitales focalizados, a la fecha se ha revisado y validado el origen del equipo adquirido y se ha determinado el requerimiento de información de los procesos de adquisición realizados por OPS.
- En proceso la formalización de la contratación de la consultoría de acompañamiento del abogado especialista en contratos FIDIC.

- **Componente III: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones tecnologías y Sistema de Información**
  Se realizó el pago final de la consultoría de asistencia técnica para la UTGP de SESAL: el ingeniero eléctrico.

- **Componente IV: Administración y Evaluación del programa**
  En ejecución las consultorías para la operatividad del programa.

  En implementación el Plan de Cierre del programa, el cual contiene las principales actividades críticas requeridas para un cierre ordenado y adecuado, incluye la gestión del último desembolso del programa, una modificación presupuestaria, la formalización de las contrataciones directas para la construcción y supervisión de la obra del Hospital Escuela y la asesoría del Abogado FIDIC en el acompañamiento de las disputas ante el DAAB en el marco del contratos de obra del Hospital de Occidente; así como, la recontratación del personal de la Unidad Ejecutora y la realización de las últimas contrataciones requeridas; asimismo, la gestión de los gastos compensables de los gastos no elegibles del contrato de obras del Hospital de Occidente:

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.4.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Proyecto De Mejora De La Gestion Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Unidades de Cuidados Intensivos	0.1	0.1	100%	0.1	0.1	100%

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

D.4.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de Mejora de la Calidad y Gestión de los servicios de salud Materno-Neonatal:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	US$	69,000,000	10/7/2019
		Lempiras	1,843,562,700	31/12/2026
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	353,661,321	353,661,321	8,963,768.4	2.5%
Acumulado 2026	353,661,321	353,661,321	41,100,801.7	11.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,843,562,700	1,843,562,700	1,283,916,861.7	69.6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026: L26.7183 por US$1.00

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.5 MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO: PROYECTO JOVEN / BID 4449/BL-HO

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.

Entre los avances físicos por componente se encuentran:

- **Componente I: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país**
    - Se realizaron los pagos finales de las estimaciones de obras de los 18 Centros que se finalizaron en el año 2026, realizando las respetivas devoluciones de las retenciones de garantías de calidad de estas.
    - Se realizaron giras de calidad y de revisión con la auditoría del TSC. Estas obras se enfocaron en los Departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, referente a los Módulos de Aulas y Rehabilitación de Centros Educativos.

- **Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.**
    - En el Componente 2 se realizaron actividades orientadas al cierre de los subcomponentes, incluyendo la sistematización de indicadores, la integración de la documentación de respaldo y cierre, así como la revisión final de las consultorías de impacto y de evaluación final.
    - Asimismo, se consolidó la reportería de la matriz de resultados, que comprende los indicadores de desarrollo, impacto y productos por componente, respaldada con información e informes oficiales del SACE, la SEDUC y otras instituciones participantes.

D.5.1 Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados.	Obra	18	18	100%	0	0	N/A

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.5.2 Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

En la siguiente tabla se observa la ejecución presupuestaria y financiera ejecutada durante la vida del proyecto y la programada y ejecutada en el presente ejercicio fiscal.

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US$	45,000,000	5/2/2018
		Lempiras	1,202,323,500	24/8/2026
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	30,037,698	30,037,698	11,871,798.1	39.5%
Acumulado 2026	30,037,698	30,037,698	22,102,858.6	73.6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,202,323,500	1,202,323,500.0	1,120,182,601.6	93.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2026: L26.7183 por US$1.00

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre, se atendieron solicitudes de ampliaciones de plazo a proyectos y además se realizaron gestiones para actualizar la herramienta informática del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) con los cambios realizados en la programación de los proyectos que ejecuta el Programa de la Red Solidaria.

Así mismo se participó en reuniones de revisión técnica con organismos financiadores y reuniones de seguimiento a los diferentes proyectos de la PRS en seguimiento al proceso de transición hacia SEDESOL y cierre de los proyectos.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

La problemática identificada por la Unidad Ejecutora se presenta en la siguiente tabla:

Proyecto	Problemática	Acciones
APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	Cierre financiero en proceso en proceso, tiempo ajustado para la ejecución de contratos y pago de consultorías.	Monitoreo continuo al proceso de cierre. Organismo financiador requiere formalizar mediante oficio el cierre y el tiempo para realizar el mismo (60 días)
	Desfases en la implementación de los contratos con la ONGs dificulta la	El programa está apuntando a la contratación de Gestores sociales que apoyen en territorio, mientras se cuenta con la publicación de los

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Proyecto	Problemática	Acciones
	intervención del Programa en territorio	contratos de las ONG en la Gaceta, al ser ratificados por el Congreso Nacional.
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LAS COMUNIDADES DE ATLÁNTIDA EN HONDURAS	El cambio de gobierno, y la transición a SEDESOL ha detenido las actividades operativas, y financieras por la no aprobación del presupuesto 2026. Además, se presenta el reto de realizar la transición del proyecto a la SESAL	Continuar con el seguimiento y coordinar la reunión con las Unidades Ejecutoras (PRS - SESAL) a fin de lograr la transición adecuada y eficiente
PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	Proceso de reconocimiento de gastos con OPS presenta atraso.	Acompañamiento por SEFIN y BID a SESAL y PRS para reforzar la importancia de la gestión.

G. CONCLUSIONES

- El Programa de la Red Solidaria mantiene la ejecución de siete proyectos financiados con organismos multilaterales; sin embargo, la aprobación tardía del Presupuesto General 2026, los procesos de transición institucional y la supresión del PRS han incidido en el ritmo de ejecución física y financiera de varios proyectos.
- Los proyectos de Integración de la Protección Social (BM 6401-HN y 6918-HN) concluyeron su ejecución física y financiera, encontrándose en la etapa de cierre administrativo y presentación de informes finales.
- El Proyecto de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO) presenta una ejecución financiera limitada durante el período, debido principalmente a retrasos administrativos y a la ratificación de contratos con organizaciones ejecutoras.
- El Proyecto de Desarrollo Infantil Temprano registra un bajo nivel de ejecución, condicionado por la transición de la unidad ejecutora hacia la Secretaría de Salud y por retrasos en la aprobación del presupuesto.
- El Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables concluyó su ejecución física y el pago completo de la auditoría
- El Proyecto de Salud Materno-Neonatal presenta avance físico de un 100%.
- El Proyecto Joven alcanzó la culminación de las obras de los 18 Centros de Educación Básica programados; y ha realizado el taller de cierre y presentación de informe final.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

H. RECOMENDACIONES

Se recomienda fortalecer la coordinación entre el PRS, SEDESOL, la Secretaría de Salud, la SEFIN y los organismos financiadores para garantizar una transición ordenada y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Asimismo, es prioritario agilizar el cierre técnico, administrativo y financiero de los proyectos finalizados, dar seguimiento a las actividades y obligaciones contractuales pendientes, completar las auditorías e informes finales y asegurar la presentación oportuna de la documentación requerida por los organismos financiadores y los entes contralores. Para ello, se propone establecer un plan de acción con responsables y plazos definidos que facilite el cumplimiento de las obligaciones y reduzca los riesgos asociados al cierre institucional del Programa de la Red Solidaria.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)			Compromiso Aprobado		
			Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
	1. Inversión Productiva														
9	**0415 - Programa de la Red Solidaria**		**622,860,221**	**622,860,221**	**725,359,430**	**725,359,430**	**45,562,393**	**45,562,393**	**6.3%**	**125,714,022**	**125,714,022**	**17.3%**	**191,262,582**	**191,262,582**	**26.4%**
0	ACTIVIDADES CENTRALES	N/D	-	-	5,937,229	5,937,229	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**-**	**-**	**5,937,229**	**5,937,229**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**
	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	61,067,896	61,067,896	255,413,665	255,413,665	11,975,192	11,975,192	4.7%	29,649,866	29,649,866	11.6%	44,672,547	44,672,547	17.5%
	TOTAL - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		**61,067,896**	**61,067,896**	**255,413,665**	**255,413,665**	**11,975,192**	**11,975,192**	**4.7%**	**29,649,866**	**29,649,866**	**11.6%**	**44,672,547**	**44,672,547**	**17.5%**
	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	IDA-6918-HN	18,973,250	18,973,250	18,973,250	18,973,250	-	-	0.0%	14,159,234	14,159,234	74.6%	14,224,350	14,224,350	75.0%
	TOTAL - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		**18,973,250**	**18,973,250**	**18,973,250**	**18,973,250**	**-**	**-**	**0.0%**	**14,159,234**	**14,159,234**	**74.6%**	**14,224,350**	**14,224,350**	**75.0%**
	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	30,037,698	30,037,698	30,037,698	30,037,698	11,871,798	11,871,798	39.5%	22,102,859	22,102,859	73.6%	22,399,266	22,399,266	74.6%
	TOTAL - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven		**30,037,698**	**30,037,698**	**30,037,698**	**30,037,698**	**11,871,798**	**11,871,798**	**39.5%**	**22,102,859**	**22,102,859**	**73.6%**	**22,399,266**	**22,399,266**	**74.6%**
	PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	BCIE-2282	110,025,789	110,025,789	12,241,000	12,241,000	10,914,915	10,914,915	89.2%	10,914,915	10,914,915	89.2%	10,914,915	10,914,915	89.2%
	TOTAL - PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO		**110,025,789**	**110,025,789**	**12,241,000**	**12,241,000**	**10,914,915**	**10,914,915**	**89.2%**	**10,914,915**	**10,914,915**	**89.2%**	**10,914,915**	**10,914,915**	**89.2%**
	Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras	TFOC3767	41,357,923	41,357,923	41,357,923	41,357,923	1,836,720	1,836,720	4.4%	4,675,317	4,675,317	11.3%	7,734,140	7,734,140	18.7%
	TOTAL - Programa de Desarrollo Infantil Temprano en las Comunidades de Atlantida en Honduras		**41,357,923**	**41,357,923**	**41,357,923**	**41,357,923**	**1,836,720**	**1,836,720**	**4.4%**	**4,675,317**	**4,675,317**	**11.3%**	**7,734,140**	**7,734,140**	**18.7%**

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)			Compromiso Aprobado		
			Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
	1. Inversión Productiva														
9	**0415 - Programa de la Red Solidaria**		**622,860,221**	**622,860,221**	**725,359,430**	**725,359,430**	**45,562,393**	**45,562,393**	**6.3%**	**125,714,022**	**125,714,022**	**17.3%**	**191,262,582**	**191,262,582**	**26.4%**
	PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS	5289/BL-HO	-	-	1,000	1,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	TOTAL - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS		**-**	**-**	**1,000**	**1,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**
	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	7,736,344	7,736,344	7,736,344	7,736,344	-	-	0.0%	3,111,030	3,111,030	40.2%	3,111,030	3,111,030	40.2%
	TOTAL - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN		**7,736,344**	**7,736,344**	**7,736,344**	**7,736,344**	**-**	**-**	**0.0%**	**3,111,030**	**3,111,030**	**40.2%**	**3,111,030**	**3,111,030**	**40.2%**
	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	353,661,321	353,661,321	353,661,321	353,661,321	8,963,768	8,963,768	2.5%	41,100,802	41,100,802	11.6%	88,206,334	88,206,334	24.9%
	TOTAL - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL		**353,661,321**	**353,661,321**	**353,661,321**	**353,661,321**	**8,963,768**	**8,963,768**	**2.5%**	**41,100,802**	**41,100,802**	**11.6%**	**88,206,334**	**88,206,334**	**24.9%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo														
	0415 - Programa de la Red Solidaria		**17,504,700**	**17,504,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		17,504,700	17,504,700	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**17,504,700**	**17,504,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**0.0%**
	Total general		**640,364,921**	**640,364,921**	**725,359,430**	**725,359,430**	**45,562,393**	**45,562,393**	**6.3%**	**125,714,022**	**125,714,022**	**17.3%**	**191,262,582**	**191,262,582**	**26.4%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0415 - Programa de la Red Solidaria								
Apoyo Al Sistema Integral De Protección Social 5008/Bl-HO	Hogares del PRS que reciben incentivo de capital semilla para fortalecer capacidades productivas en emprendimiento 5008/BL-HO	Hogares	1000	0	0%	0	0	N/A
	Reporte generado de los participantes del PRS que reciben incentivos de capital semilla, remitido al organismo financiador.	Reporte	1	0	0%	0	0	N/A
	Contrato suscrito con ONG para impartir capacitaciones a jóvenes beneficiados por el PRS.	Contrato	1	0	0%	1	0	0%
	Contrato suscrito para la evaluación de las intervenciones integrales del PRS.	Contrato	1	1	**100%**	1	1	**100%**

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa De Desarrollo Infantil Temprano En Las Comunidades De Atlantida En Honduras (TFOC 3767)	Mujeres embarazadas del Departamento de Atlántida beneficiadas con la entrega de los KITS. BM TF 0C3767	Kits entregados	500	0	0%	0	0	N/A
	Mejorados los espacios físicos en centros de salud, para habilitación de Bebetecas para niños pequeños en el Departamento de Atlántida.	Obra	2	0	0%	0	0	N/A

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Número de mujeres embarazadas que reciben servicios de salud y nutrición del Plan Crecer (numero)	Número	1000	165	17%	99	99	N/A
Proyecto De Mejora De La Gestión Y Calidad De Los Servicios De Salud Materno-Neonatal	Unidades de Cuidados Intensivos (UCIN), y Salas de Neonatología de obras hospitalarias construidas.	Unidades de Cuidados Intensivos	0.1	0.1	100%	0.1	0.1	100%
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados.	Obra	18	18	100%	0	0	N/A

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
