SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Informe No. 0513-003-2026

Tegucigalpa, Octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 5
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 6
D. PRINCIPALES PROYECTOS 8
D.1 Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. / BID 5832/BL-HO 8
E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL III TRIMESTRE 2026 12
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 14
G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 14
H. CONCLUSIONES 16
I. RECOMENDACIONES 17
ANEXO 1 19
ANEXO 2 20

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras, creado mediante Decreto No. 86-2000 y adscrito a la Secretaría de Estado de la Presidencia (SEP), constituye la entidad rectora del Sistema Estadístico Nacional (SEN), con la responsabilidad de coordinar y regular la producción, recolección, análisis y publicación de las operaciones estadísticas oficiales del país, provenientes de censos, encuestas y registros administrativos recopilados a través del SEN, los cuales sirven como referentes fundamentales para los distintos tomadores de decisiones del ámbito público y privado. En congruencia con este mandato, su visión es consolidarse como el referente nacional e internacional en la generación y gestión de estadísticas oportunas y confiables, que contribuyan directamente al fortalecimiento y creación de políticas públicas efectivas, encaminadas al bienestar de la sociedad.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**515,529,840**
Inversión Productiva	510,408,559
Formación Bruta de Capital	5,121,281
Presupuesto Vigente	**1,100,129,840**
Inversión Productiva	1,095,008,559
Formación Bruta de Capital	5,121,281
Ejecutado III Trimestre	**253,432,721**
Inversión Productiva	252,783,258
Formación Bruta de Capital	649,463
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**23.0%**
Ejecutado Anual	**275,824,666**
Inversión Productiva	274,316,469
Formación Bruta de Capital	1,508,197
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**25.1%**
Compromiso Aprobado	**901,247,772**
Inversión Productiva	899,069,424
Formación Bruta de Capital	2,178,348
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**81.9%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

Para dar cumplimiento a este cometido, el INE desarrolla cinco objetivos generales que estructuran su labor estratégica:

1. Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistematizada de estadísticas confiable y oportunas necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público y privado del país;
2. Establece la normatividad necesaria para integrar y racionalizar las actividades estadísticas oficiales, coordinando acciones entre productores y usuarios de las estadísticas y de actividades conexas, a fin de optimizar el uso de los recursos;
3. Establecer la programación para las actividades de diseño, recopilación, procesamiento, análisis, difusión y publicación de la información de la estadística oficial del país, obtenida mediante levantamientos censales, encuestas por muestreo y el uso de los registros administrativos;

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

4. Promover el interés por las actividades estadísticas en todos los sectores de la población y sus autoridades, para crear una cultura estadística, a fin de lograr una activa participación y permanente, colaboración fortaleciendo al Sistema Estadístico Nacional (SEN), y
5. Promover la capacitación y la investigación.

Durante el ejercicio fiscal 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha concentrado sus esfuerzos en la ejecución del **XVIII Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2026),** en el marco del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el Contrato de Préstamo No. 5832/BL-HO. Este proceso constituye una de las principales iniciativas estratégicas del país para actualizar la información demográfica, habitacional y socioeconómica, mediante la generación de estadísticas oficiales confiables, oportunas y desagregadas que contribuyan a fortalecer la planificación del desarrollo nacional, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones basada en evidencia.

Para la Secretaría de Finanzas (SEFIN), particularmente a través de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), la información que generará el CNPV 2026 constituye un insumo estratégico para fortalecer los procesos de identificación, formulación, evaluación, priorización y seguimiento de los proyectos de inversión pública. La disponibilidad de información sociodemográfica actualizada y territorialmente desagregada permitirá identificar con mayor precisión las brechas de acceso a servicios básicos, infraestructura y equipamiento social, establecer líneas base e indicadores de resultados, estimar la demanda actual y futura de servicios públicos y orientar la asignación de recursos hacia las intervenciones con mayor impacto económico y social.


Considerando que el último Censo Nacional de Población y Vivienda se realizó en 2013, la actualización de la información estadística nacional adquiere especial relevancia, debido a los cambios demográficos, sociales, económicos y territoriales experimentados por el país durante los últimos trece años. La utilización de información censal desactualizada puede generar limitaciones en la estimación de necesidades, la focalización territorial de las intervenciones y la evaluación de los beneficios esperados de los proyectos, afectando la eficiencia y efectividad de la inversión pública.

En este contexto, la culminación oportuna del operativo censal, la calidad y cobertura de la información recopilada y el cumplimiento de las actividades postcensales constituyen prioridades fundamentales para el cierre del ejercicio fiscal 2026. Asimismo, resulta indispensable garantizar el procesamiento, validación y difusión de los resultados, de manera que la inversión realizada se traduzca en información estadística útil para la planificación presupuestaria, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH), la gestión por resultados y la toma de decisiones estratégicas orientadas al desarrollo sostenible del país.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

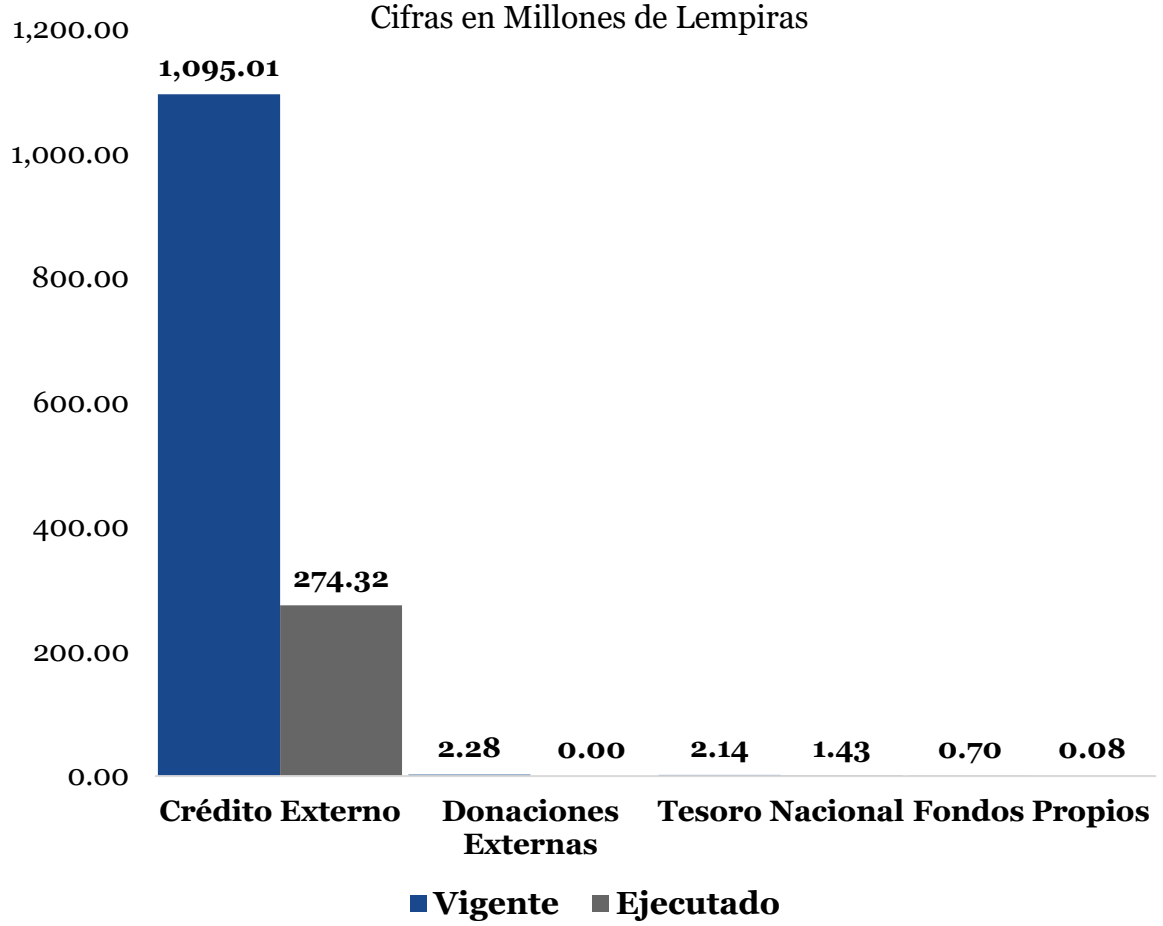

Fuente: SIAFI

Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un presupuesto vigente de inversión pública de **L1,100.1 millones**, de los cuales **L1,095.0 millones** corresponden a Inversión Productiva y **L5.1 millones** a Formación Bruta de Capital Fijo. Al 30 de septiembre de 2026, la ejecución presupuestaria acumulada ascendió a L275.8 millones, equivalente al 25.1% del presupuesto vigente, evidenciando un incremento significativo respecto al segundo trimestre, asociado principalmente al desarrollo del operativo del XVIII Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2026), tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

En cuanto a la composición del financiamiento, el **99.5%** del presupuesto vigente de inversión pública de la institución (L1,095.0 millones) corresponde a recursos de Crédito Externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a la ejecución del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, financiado mediante el Contrato de Préstamo No. 5832/BL-HO. Este constituye el único proyecto de inversión pública en ejecución por parte del INE, lo que refleja la elevada concentración de los recursos institucionales de inversión en el desarrollo del operativo censal y las actividades complementarias de fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. El restante **0.5%** del presupuesto vigente (L5.1 millones) corresponde a recursos del Tesoro Nacional (L2.1 millones), Recursos Propios (L0.7 millones) y Donaciones Externas (L2.3 millones), conforme se presenta en el Gráfico No. 1.

Por su parte, la ejecución correspondiente a Formación Bruta de Capital Fijo ascendió a **L1.5 millones**, equivalente al 29.4% de su presupuesto vigente, concentrándose principalmente en recursos del Tesoro Nacional y Recursos Propios, destinados al programa de Producciones Estadísticas. Este programa contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la generación de información estadística oficial en los ámbitos socioeconómico y demográfico, mediante el desarrollo de censos, encuestas y el aprovechamiento de registros administrativos, proporcionando información confiable y oportuna para apoyar la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas del país.

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

Gráfico No. 2

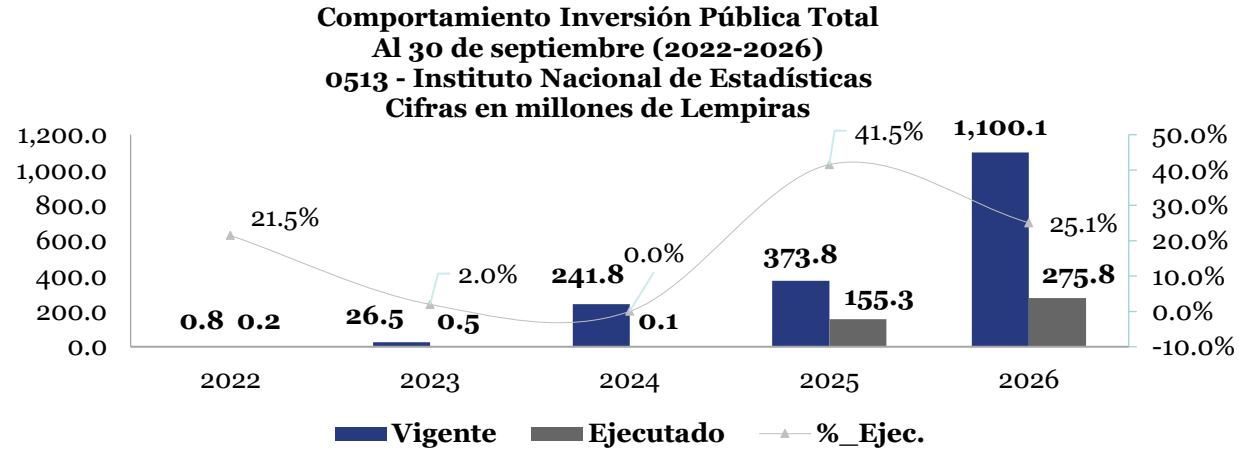

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

La Gráfica No. 2 presenta el comportamiento histórico de la ejecución presupuestaria de inversión pública del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el período 2022-2026, con énfasis en la evolución de las asignaciones presupuestarias y los niveles de ejecución registrados. Para el ejercicio fiscal 2026, la institución presenta un incremento significativo de su presupuesto vigente, que al cierre del tercer trimestre ascendió a L1,100.1 millones, de los cuales se ejecutaron L275.8 millones, equivalentes al 25.1%. Este comportamiento refleja una importante aceleración de la ejecución respecto al primer semestre, impulsada principalmente por el inicio y desarrollo del operativo del XVIII Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2026).

2022: Durante este ejercicio fiscal, la inversión pública del INE estuvo orientada principalmente al fortalecimiento de las capacidades institucionales y al desarrollo de actividades relacionadas con la producción estadística nacional. La institución mantuvo niveles relativamente bajos de asignación y ejecución presupuestaria, en un contexto previo a la aprobación del financiamiento externo destinado al nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda.

2023: Se registró un incremento de la asignación presupuestaria respecto al año anterior, en un período caracterizado por las gestiones técnicas, administrativas y financieras para la preparación del nuevo operativo censal. Entre los principales hitos destacan la estructuración del Programa, la definición de sus componentes y la aprobación y suscripción del Contrato de Préstamo BID No. 5832/BL-HO, por USD50.0 millones, en diciembre de 2023. No obstante, la ejecución presupuestaria se mantuvo limitada debido a que el financiamiento se encontraba en sus etapas iniciales de formalización.

2024: La institución experimentó un incremento de los recursos presupuestarios destinados a inversión pública, asociado a la incorporación del financiamiento externo del Programa. Sin embargo, la ejecución estuvo condicionada por los procesos de cumplimiento de las condiciones contractuales, la elegibilidad para desembolsos, la planificación operativa y la preparación de los procedimientos de adquisición y contratación necesarios para implementar las actividades censales. Estas circunstancias incidieron en el ritmo de ejecución durante la fase inicial del Programa.

2025: Se observó una mayor dinamización de las actividades preparatorias del CNPV, particularmente en los procesos de planificación del operativo, actualización cartográfica, fortalecimiento tecnológico, preparación metodológica y organización de los procedimientos de contratación de bienes y servicios especializados. Estos avances contribuyeron a establecer las condiciones técnicas y operativas necesarias para desarrollar el levantamiento censal durante 2026, aunque persistieron desafíos relacionados con los tiempos de contratación y la ejecución de los recursos programados.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

2026: Al cierre del tercer trimestre, el INE registró su mayor asignación presupuestaria del período analizado, con un presupuesto vigente de L1,100.1 millones y una ejecución acumulada de L275.8 millones (25.1%). En comparación con el segundo trimestre, cuando la ejecución ascendía a L22.4 millones (4.3%), se evidencia una aceleración significativa del gasto, con un incremento de aproximadamente L253.4 millones durante el período julio - septiembre. Este comportamiento responde principalmente al desarrollo del operativo censal, incluyendo la contratación y movilización del personal de campo, los servicios logísticos, la campaña de comunicación y las demás actividades necesarias para la recolección de información a nivel nacional.

No obstante, pese a la mejora observada, el nivel de ejecución presupuestaria continúa siendo relativamente bajo frente al volumen de recursos disponibles, registrándose un saldo pendiente de ejecución de aproximadamente L824.3 millones, equivalente al 74.9% del presupuesto vigente. Esta situación representa un desafío importante para el último trimestre del ejercicio fiscal, considerando la necesidad de atender los compromisos derivados del levantamiento censal, completar los procesos de pago y liquidación del personal contratado y avanzar en las actividades de procesamiento, validación y evaluación de la información recopilada.

D. PRINCIPALES PROYECTOS

Al cierre del Terce trimestre de 2026, el INE cuenta con un único proyecto de inversión productiva el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, con código BIP 25298.

D.1 Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. / BID 5832/BL-HO

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

El objetivo general del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, financiado mediante el Contrato de Préstamo BID No. 5832/BL-HO, es incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas. Sus objetivos específicos son: (i) mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad; y (ii) fortalecer la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), mediante el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y operativas para la producción, procesamiento y difusión de información estadística.

Al 30 de septiembre de 2026 se registra un avance físico general acumulado del 54%, conforme al seguimiento del Plan de Ejecución Plurianual (PEP). Este avance refleja la culminación de importantes actividades preparatorias y el inicio y desarrollo del operativo de levantamiento del XVIII Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2026), principal intervención del Programa durante el presente ejercicio fiscal.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Entre los principales hitos alcanzados se destacan:

1. Finalización de la actualización cartográfica y de las actividades metodológicas y técnicas preparatorias para el levantamiento censal.
2. Realización del Censo Piloto Experimental en Orica, Francisco Morazán, y preparación de la boleta censal definitiva.
3. Adquisición de 16,200 dispositivos móviles (tabletas) destinados a la captura digital de información durante el operativo censal.
4. Adquisición y distribución de indumentaria, insumos y materiales requeridos para el desarrollo de las actividades de campo.
5. Aprobación e implementación de los procedimientos de reclutamiento masivo y contratación del personal necesario para el CNPV.
6. Inicio y desarrollo del operativo nacional de levantamiento censal, mediante el despliegue del personal contratado en los diferentes departamentos del país.
7. Inicio de la campaña de comunicación y sensibilización dirigida a promover la participación de la población en el proceso censal.
8. Implementación y fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos de monitoreo y supervisión del trabajo de campo, orientados a dar seguimiento a la productividad del personal y la cobertura censal.
9. Incorporación de recursos de financiamiento externo al presupuesto institucional, permitiendo atender las necesidades financieras relacionadas con el desarrollo del operativo censal.

Estos avances representan una transición importante desde la fase de preparación hacia la ejecución de las actividades sustantivas del CNPV 2026. No obstante, al cierre del tercer trimestre persisten desafíos relacionados con la culminación del levantamiento censal, el cierre administrativo y financiero de las contrataciones, la liquidación de pagos al personal de campo y la preparación de las actividades postcensales, particularmente el procesamiento y validación de las bases de datos y la evaluación de cobertura censal.

A continuación, se presenta el estado de las principales actividades y productos del Programa, tomando como referencia la información proporcionada por la Unidad Ejecutora y la programación de metas físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2026:

A continuación, se describen el estado de actividades clave del CNPV y su porcentaje de cumplimiento, según lo reportado por la Unidad Ejecutora del mismo:

Actividad clave	% Cumplimiento	Estado
Boleta censal	100%	Finalizada
Manual de Reclutamiento Masivo	100%	Finalizado y en ejecución
Actualización Cartográfica	100%	Revisada y Finalizada

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Actividad clave	% Cumplimiento	Estado
Censo Piloto Experimental en Orica, Francisco Morazán	100%	Finalizado
Adquisición de 16,200 tabletas	100%	Entregados
Indumentaria Censal adquirida	100%	Entregados
Carnés de identificación	100%	Entregados
Campaña de Comunicación	100%	En ejecución
Compra de insumos y materiales para logística y campo	100%	Proveedores contratados y tiempo de entrega
Alquiler de Vehículos para CNPV	100%	En ejecución
Plataforma tecnológica para el reclutamiento y selección del personal de campo del proyecto (CNPV)	100%	En ejecución
Contratación del personal del CNPV	Hito cumplido	Contratación realizada
Operativo nacional de levantamiento censal	En desarrollo	Iniciado durante el trimestre
Procesamiento y validación de la base censal	Pendiente de producto final	Actividad postcensal

Fuente: INE

Durante el tercer trimestre de 2026, el Programa registró avances significativos, destacándose la contratación masiva del personal de campo, el inicio del levantamiento censal y la implementación de la campaña de comunicación. No obstante, persisten desafíos relacionados con la culminación del operativo, la cobertura territorial, el pago oportuno de censistas y supervisores y el cierre de las contrataciones, aspectos fundamentales para garantizar el cumplimiento del cronograma y la calidad de la información recopilada.

Para atender estos desafíos, la Unidad Ejecutora ha implementado medidas correctivas orientadas a mejorar los mecanismos de pago y liquidación a través de la banca privada, así como el monitoreo de la productividad del personal mediante plataformas tecnológicas. Asimismo, durante el trimestre se realizaron incorporaciones presupuestarias de recursos externos para atender las necesidades financieras del operativo censal.

Desde la perspectiva de la SEFIN/DGIP, si bien se evidencia una aceleración de la ejecución física y financiera, persisten riesgos asociados a la culminación del levantamiento censal y al cumplimiento de las actividades postcensales. En consecuencia, resulta prioritario fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestaria, la evaluación de cobertura y el procesamiento y validación de los datos, a fin de garantizar la disponibilidad oportuna de información estadística confiable para la planificación y focalización de la inversión pública nacional.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejec	Programación	Ejecución	% Ejec
Finalizado el Censo Nacional de Población y Vivienda de la Republica de Honduras	Censo	1	0	0%	0	0	0%
Campaña de comunicación y sensibilización censal desarrolladas	Campaña	0.5	0.25	50%	0.25	0.25	100%
Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	1	0	0%	0	0	0%
Diseminación de la Información del Censo Agropecuario	Estudios	1	0	0%	0	0	0%
Estrategia de ciberseguridad desarrollada	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

Evaluación Financiera III trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	BID 5832/BL-HO	Dólares Lempiras	50,000,000.00 1,335,915,000.00	29/02/2024 - 29/02/2028
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	510,408,559.00	1,095,008,559.00	252,783,257.92	23.1%
Acumulado 2026	510,408,559.00	1,095,008,559.00	274,316,468.78	25.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,335,915,000.00	1,335,915,000.00	454,570,667.71	34.0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

E. PRINCIPALES ADQUISICIONES AL III TRIMESTRE 2026

Durante el tercer trimestre de 2026, el INE reportó varias adquisiciones realizadas en el marco del Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. A continuación, se detallan las más relevantes:

No.	Tipo de Contrato	No. de Contrato	Firma de Contrato	Adjudicatario	Monto de contrato	Plazo	Fecha de Finalización
1	Contratación de Servicio de Transporte Logístico, Distribución y Devolución del Equipo Censal para el CNPV	INE-CNPV-SNC-16-2026	21/07/2026	Faith Company, S. de R.L.	L 1,025,432.00	124 días calendario	21/11/2026
2	"Adquisición de Insumos y Materiales para actividades complementarias de carnetización del Censo Nacional de Población y Vivienda", Lotes #1, 2 y 3.	INE-CNPV-GO-21-2026	21/07/2026	Distribuciones y Representaciones FRANEL, S.A. de C.V.	L 118,680.00	4 días calendario	24/07/2026
3	"Adquisición de Insumos y Materiales para actividades complementarias de carnetización del Censo Nacional de Población y Vivienda", Lote #4	INE-CNPV-GO-22-2026	21/07/2026	Grupo MPC Print Center, S. de R.L.	L 169,337.50	4 días calendario	24/07/2026
4	Servicios bancarios integrales para el pago de sueldos, viáticos y estipendios del personal del censo Nacional de Población y Vivienda	INE-CNPV-SNC-17-2026	22/07/2026	Banco Atlántida, S.A.	Hasta USD 250,000.00	275 días calendario	22/04/2027
5	Servicios bancarios integrales para el pago de sueldos, viáticos y estipendios del personal del censo Nacional de Población y Vivienda	INE-CNPV-SNC-18-2026	22/07/2026	Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.	Hasta USD 250,000.00	275 días calendario	22/04/2027

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

No.	Tipo de Contrato	No. de Contrato	Firma de Contrato	Adjudicatario	Monto de contrato	Plazo	Fecha de Finalización
6	Servicios bancarios integrales para el pago de sueldos, viáticos y estipendios del personal del censo Nacional de Población y Vivienda	INE-CNPV-SNC-19-2026	22/07/2026	Banco de Occidente, S.A.	Hasta USD 250,000.00	275 días calendario	22/04/2027
7	Servicios bancarios integrales para el pago de sueldos, viáticos y estipendios del personal del censo Nacional de Población y Vivienda	INE-CNPV-SNC-20-2026	22/07/2026	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Hasta USD 250,000.00	275 días calendario	22/04/2027
8	Adquisición de material de embalaje para el equipo del Censo Nacional de Población y Vivienda, Ítem #1, 2 y 3	INE-CNPV-GO-23-2026	23/07/2026	Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)	L 181,987.50	12 días calendario	03/08/2026
9	Adquisición de material de embalaje para el equipo del Censo Nacional de Población y Vivienda, Ítem #4	INE-CNPV-GO-24-2026	22/07/2026	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L. de C.V.	L 1,656.00	6 días calendario	27/07/2026
10	"Adquisición de Insumos de Papelería y Archivo de Expedientes del Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional", Lotes #1, 2, 3 y 4	INE-CNPV-GO-25-2026 -	24/07/2026	Distribuciones y Representaciones FRANEL, S.A. de C.V.	L 25,156.25	5 días calendario	28/07/2026
11	"Adquisición de Papelería de etiquetado de los bienes adquiridos en el marco del Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional"	INE-CNPV-GO-26-2026	24/07/2026	Distribuciones y Representaciones FRANEL, S.A. de C.V.	L 35,650.00	5 días calendario	28/07/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

No.	Tipo de Contrato	No. de Contrato	Firma de Contrato	Adjudicatario	Monto de contrato	Plazo	Fecha de Finalización
12	"Adquisición de Licencias de Software para el Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del INE", Lotes #1, 2 y 3	INE-CNPV-B-4-2026	16/09/2026	CENTROMATIC, S.A.	L 1,075,054.75	9 días calendario	24/09/2026

Fuente: INE

F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En el marco del seguimiento a la cartera de Proyectos de Inversión Pública (PIP) ejecutados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el trimestre se realizaron diversas acciones orientadas a garantizar la fluidez operativa, financiera y normativa de los proyectos en ejecución. A continuación, se detallan los principales hitos de gestión de la inversión correspondientes al período:

- Se dictaminaron cuatro (4) modificaciones presupuestarias que afectaron al proyecto de inversión pública con el propósito de realizar traslados dentro del mismo proyecto e incorporaciones presupuestarias de recursos de crédito externo, orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos para atender los compromisos financieros del operativo censal, particularmente la contratación y pago del personal de campo, servicios logísticos y demás actividades programadas.
- Desarrollo de reuniones de coordinación con la Unidad Ejecutora del Programa para analizar los avances físicos y financieros, las proyecciones de ejecución presupuestaria y los requerimientos de recursos para la culminación del levantamiento censal y las actividades previstas para el último trimestre de 2026.
- Participación en la Revisión Técnica de Cartera del segundo semestre de 2026, entre el BID, SEFIN y el INE, efectuada de manera presencial en agosto de 2026.

G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

Durante el tercer trimestre de 2026, el INE continuó impulsando la ejecución del Programa de Apoyo al Censo Nacional de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional; sin embargo, el desarrollo del proyecto enfrentó limitaciones de carácter técnico, administrativo, financiero y de contratación que incidieron en el cumplimiento de la programación física y financiera. Entre las principales problemáticas identificadas destacan las siguientes:

- **Baja ejecución financiera y concentración de compromisos financieros en el último trimestre:**

  - ✓ **Problemática:** Al 30 de septiembre de 2026, el INE registró una ejecución presupuestaria acumulada de L275.8 millones (25.1%) respecto a un presupuesto vigente de L1,100.1 millones, mientras que el avance físico general del Programa alcanzó el 54%, según el Plan de Ejecución Plurianual (PEP). A pesar de la aceleración registrada durante el trimestre, persiste una brecha entre la ejecución física y financiera, así como un elevado volumen de recursos pendientes de ejecución.
  - ✓ **Acciones:** La Unidad Ejecutora del Programa (UEP) gestionó incorporaciones presupuestarias de recursos externos para atender las obligaciones del operativo censal y fortaleció el seguimiento a la programación financiera, priorizando los compromisos relacionados con la contratación de personal, servicios logísticos y demás actividades críticas del levantamiento censal.

- **Dificultades en los procesos de pago y liquidación del personal censal:**

  - ✓ **Problemática:** La contratación masiva de censistas y supervisores generó importantes desafíos administrativos y financieros para procesar oportunamente los pagos, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y realizar las liquidaciones correspondientes, con el riesgo de afectar la continuidad y el cierre del operativo censal.
  - ✓ **Acciones:** La UEP implementó mejoras en los mecanismos de pago y liquidación a través de la banca privada, fortaleciendo los controles administrativos y el seguimiento a las obligaciones financieras derivadas de la contratación del personal de campo**.**

- **Desafíos operativos y logísticos para garantizar la cobertura del levantamiento censal:**

  - ✓ **Problemática:** El desarrollo del CNPV 2026 requiere una amplia movilización de personal, equipos tecnológicos, transporte e insumos a nivel nacional. Asimismo, las dificultades de acceso a determinadas zonas, el porcentaje de rechazo de la población y la necesidad de ampliar el período de levantamiento representan riesgos para alcanzar la cobertura prevista y cumplir con el cronograma establecido.
  - ✓ **Acciones:** El INE fortaleció los mecanismos de supervisión y monitoreo del trabajo de campo mediante la plataforma tecnológica de seguimiento censal, mejorando el control de la productividad de los censistas y la identificación de áreas que requieren atención adicional. Asimismo, se implementó la campaña de comunicación y sensibilización para promover la participación de la población.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- **Riesgos de retraso en el procesamiento, validación y difusión de la información censal:**

  - ✓ **Problemática:** La necesidad de culminar el levantamiento censal y garantizar la calidad de la información recopilada podría incidir en el inicio oportuno de las actividades postcensales, particularmente la depuración y validación de las bases de datos, la evaluación de cobertura y la generación de resultados estadísticos.
  - ✓ **Acciones:** La UEP ha contemplado en su programación el cierre operativo y financiero del levantamiento censal, el procesamiento y generación de la base censal definitiva y la preparación de la evaluación de cobertura, actividades que deberán priorizarse durante el cuarto trimestre de 2026 para asegurar el cumplimiento de los productos y resultados previstos.

- **Necesidad de fortalecer la coordinación y el seguimiento a los compromisos del Programa:**

  - ✓ **Problemática:** La concentración de actividades operativas, administrativas y financieras durante el segundo semestre, sumada a los riesgos asociados a cambios de personal de la UEP, representa un desafío para la coordinación institucional y el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos con el BID.
  - ✓ **Acciones:** Se ha mantenido el seguimiento técnico y financiero entre el INE, la Secretaría de Finanzas y el BID, particularmente mediante las revisiones de cartera y el monitoreo de los acuerdos relacionados con la ejecución presupuestaria, los procesos de adquisiciones y el cumplimiento de los resultados del Programa.

H. CONCLUSIONES

- Al cierre del tercer trimestre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un presupuesto vigente de inversión pública de L1,100.1 millones, de los cuales el 99.5% corresponde a recursos de Crédito Externo del BID, destinados al Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional. La ejecución presupuestaria acumulada ascendió a L275.8 millones (25.1%), evidenciando una aceleración significativa respecto al segundo trimestre. Sin embargo, persiste un importante saldo pendiente de ejecución que requiere atención durante el último trimestre del ejercicio fiscal.
- El Programa alcanzó un avance físico acumulado del 54%, según el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), destacándose la culminación de las actividades preparatorias, la contratación masiva del personal de campo, el inicio del operativo nacional de levantamiento censal y la implementación de la campaña de comunicación. Estos avances reflejan la transición hacia la fase de ejecución intensiva del CNPV 2026, aunque persisten desafíos para garantizar su culminación y la calidad de la información recopilada.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Durante el trimestre se efectuaron incorporaciones presupuestarias de recursos de crédito externo, incrementando la disponibilidad financiera para atender los compromisos del operativo censal. No obstante, persisten desafíos relacionados con la programación financiera, el pago oportuno de censistas y supervisores y la liquidación de las obligaciones contractuales, aspectos que requieren seguimiento para evitar retrasos en el cierre operativo y financiero del levantamiento.
- Desde la perspectiva de la DGIP, si bien se registraron avances importantes en la ejecución física y financiera, la concentración de recursos y actividades pendientes durante el cuarto trimestre representa un riesgo para el cumplimiento de la programación anual. En consecuencia, resulta fundamental fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestaria, la cobertura censal y las actividades postcensales, particularmente el procesamiento, validación y evaluación de la información recopilada.
- Desde la perspectiva de la DGIP, el INE está en una fase de preparación operativa intensiva que requerirá acompañamiento cercano en programación presupuestaria, monitoreo físico-financiero y gestión de incorporaciones presupuestarias para asegurar el censo en los plazos establecidos y la disponibilidad de datos para la focalización territorial y actualización de líneas base.
- El CNPV 2026 constituye una intervención estratégica para actualizar la información demográfica, social y económica del país, considerando que el último censo se realizó en 2013. Sus resultados permitirán fortalecer la identificación de brechas territoriales, la formulación y evaluación de proyectos, la actualización de líneas base y la focalización de la inversión pública, contribuyendo a una asignación más eficiente y equitativa de los recursos del Estado.

I. RECOMENDACIONES

Con el propósito de fortalecer la gestión de la inversión pública del INE, atender los desafíos identificados durante el tercer trimestre de 2026 y contribuir al cumplimiento de las metas físicas y financieras del Programa, se formulan las siguientes recomendaciones:

- Considerando que al 30 de septiembre de 2026 se registra un saldo presupuestario pendiente de ejecución de aproximadamente L824.3 millones (74.9%), se recomienda que el INE implemente un plan de ejecución financiera para el cuarto trimestre, priorizando las obligaciones contractuales, los pagos al personal censal, los servicios logísticos y las actividades postcensales programadas, procurando reducir las desviaciones respecto a la programación anual.
- Fortalecer los mecanismos administrativos y financieros de pago a censistas y supervisores, mediante una coordinación efectiva con las instituciones bancarias y las instancias correspondientes de la SEFIN, a fin de garantizar la liquidación oportuna de las obligaciones contractuales y evitar retrasos en el cierre financiero del operativo.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Se recomienda continuar con la estrategia de reuniones periódicas de seguimiento entre la Unidad Ejecutora, la DGIP y las instancias correspondientes de la SEFIN, para evaluar el cumplimiento del PEP, la ejecución presupuestaria, los procesos de adquisiciones y los compromisos derivados de las revisiones de cartera con el BID, identificando oportunamente desviaciones y medidas correctivas.
- Se recomienda que el INE asegure la programación técnica y financiera de las actividades de procesamiento, depuración, validación y difusión de la información censal, así como la evaluación de cobertura y la actualización de las proyecciones de población. Asimismo, deberá impulsar las actividades de fortalecimiento tecnológico e institucional del Sistema Estadístico Nacional, garantizando que los resultados del CNPV se traduzcan en información estadística confiable y oportuna para la planificación del desarrollo y la toma de decisiones de inversión pública.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 1

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	**1. Inversión Productiva**		**-**	**510,408,559**	**510,408,559**	**-**	**1,095,008,559**	**1,095,008,559**	**-**	**252,783,258**	**252,783,258**	**23.1%**	**-**	**274,316,469**	**274,316,469**	**25.1%**
1	**0513 - Instituto Nacional de Estadísticas**		**-**	**510,408,559**	**510,408,559**	**-**	**1,095,008,559**	**1,095,008,559**	**-**	**252,783,258**	**252,783,258**	**23.1%**	**-**	**274,316,469**	**274,316,469**	**25.1%**
1	Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	5832/BL-HO	-	510,408,559	510,408,559	-	1,095,008,559	1,095,008,559	-	252,783,258	252,783,258	23.1%	-	274,316,469	274,316,469	25.1%
	TOTAL - PROGRAMA DE APOYO AL CENS		**-**	**510,408,559**	**510,408,559**	**-**	**1,095,008,559**	**1,095,008,559**	**-**	**252,783,258**	**252,783,258**	**23.1%**	**-**	**274,316,469**	**274,316,469**	**25.1%**
	2. Formación Bruta de		**2,839,281**	**2,282,000**	**5,121,281**	**2,839,281**	**2,282,000**	**5,121,281**	**649,463**	**-**	**649,463**	**12.7%**	**1,508,197**	**-**	**1,508,197**	**29.4%**
	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		**2,839,281**	**2,282,000**	**5,121,281**	**2,839,281**	**2,282,000**	**5,121,281**	**649,463**	**-**	**649,463**	**12.7%**	**1,508,197**	**-**	**1,508,197**	**29.4%**
	PRODUCCIONES ESTADISTICAS		2,839,281	2,282,000	5,121,281	2,839,281	2,282,000	5,121,281	649,463	-	649,463	12.7%	1,508,197	-	1,508,197	29.4%
	TOTAL - PRODUCCIONES ESTADISTICAS		**2,839,281**	**2,282,000**	**5,121,281**	**2,839,281**	**2,282,000**	**5,121,281**	**649,463**	**-**	**649,463**	**12.7%**	**1,508,197**	**-**	**1,508,197**	**29.4%**
	Total general		**2,839,281**	**512,690,559**	**515,529,840**	**2,839,281**	**1,097,290,559**	**1,100,129,840**	**649,463**	**252,783,258**	**253,432,721**	**23.0%**	**1,508,197**	**274,316,469**	**275,824,666**	**25.1%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

EJECUCIÓN FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0513 - Instituto Nacional de Estadística								
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional / BID 5832/BL-HO	Finalizado el Censo Nacional de Población y Vivienda de la Republica de Honduras	Censo	1	0	0%	0	0	0%
	Campaña de comunicación y sensibilización censal desarrolladas	Campaña	0.5	0.25	50%	0.25	0.25	100%
	Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	1	0	0%	0	0	0%
	Diseminación de la Información del Censo Agropecuario	Estudios	1	0	0%	0	0	0%
	Estrategia de ciberseguridad desarrollada	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%

Nota **:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
