SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

# PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

# Secretaría de Ciencia Innovación y Tecnología (SENACIT)

**Informe No. 00515-003-2026**

**Tegucigalpa, Octubre 2026**

# Contenido

Contenido ..... 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN ..... 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ..... 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ..... 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 4
D. PRINCIPALES PROYECTOS ..... 5
D.1 El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) cuenta con el proyecto de inversión productiva siguiente: ..... 5
1. "Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras". ..... 5
El proyecto de IHCIETI No tuvo actividades físicas ejecutadas durante este período: ..... 5
Las metas programadas para 2026 son los siguientes: ..... 5
D.1.1. Evaluación Financiera al III trimestre 2026 ..... 6
D.1.2. Principales Adquisiciones al III trimestre 2026 ..... 6
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN ..... 7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 ..... 7
G. CONCLUSIONES ..... 8
H. RECOMENDACIONES ..... 8
ANEXO 1 ..... 9



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

## A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) despliega esfuerzos significativos en respaldo a la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Honduras. Sus actividades abarcan diversas áreas estratégicas; en segundo lugar, se destaca su labor en la armonización de relaciones, actuando como facilitador en la colaboración entre el gobierno, la academia y el sector privado. Esta sinergia es clave para impulsar iniciativas conjuntas que beneficien el desarrollo científico y tecnológico del país.

Además, el IHCIETI se involucra activamente en la mejora de políticas y programas relacionados con la ciencia y la tecnología, contribuyendo de manera directa al diseño e implementación de marcos normativos que estimulan la innovación y el progreso en estos campos. Asimismo, enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades humanas, promoviendo la formación y el fortalecimiento de competencias en el capital humano hondureño para enfrentar los retos y oportunidades del entorno tecnológico actual y futuro.

Cuadro No. 01
**Programa de Inversión Pública, al III**
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|---|---|
| **Presupuesto Aprobado** | **73,406,231.0** |
| Inversión Productiva | 73,106,231.0 |
| Formación Bruta de Capital | 300,000.0 |
| **Presupuesto Vigente** | **74,426,231.0** |
| Inversión Productiva | 73,106,231.0 |
| Formación Bruta de Capital | 1,320,000.0 |
| **Ejecutado III Trimestre** | **2,895,002.3** |
| Inversión Productiva | 2,626,802.6 |
| Formación Bruta de Capital | 268,199.7 |
| **% Ejecución (Ejecutado III Trim-** | **4%** |
| **Ejecutado Anual** | **2,895,002.3** |
| Inversión Productiva | 2,626,802.6 |
| Formación Bruta de Capital | 268,199.7 |
| **% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)** | **4%** |
| **Compromiso Aprobado** | **2,904,202.3** |
| Inversión Productiva | 2,636,002.6 |
| Formación Bruta de Capital | 268,199.7 |
| **% Compromiso (Compromiso III Trim-** | **4%** |

***Nota: SIAFI, 30/09/2026***

Al III trimestre, la institución dispuso de un presupuesto vigente de L74.4 millones, de los cuales L73.1 millones corresponden a inversión productiva y L 1.32 millones en formación bruta de capital, al III trimestre se muestra ejecución L2.6 millones del presupuesto asignado a inversion productiva y L0.3 milones de inversion bruta de capital.

En el marco del PCM 04-2026, artículo 17, y en estricta aplicación de lo establecido en el artículo 98 reformado de la Ley General de la Administración Pública, se dispone la intervención de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En tal sentido, la Comisión Interventora será integrada mediante Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República, en el cual se establecerán los plazos de vigencia de la intervención, así como los términos para la presentación de los informes correspondientes, ejerciendo para todos los efectos las atribuciones contenidas en el citado artículo 98. En consecuencia, durante el período informado no fue posible registrar avances físicos ni financieros en la ejecución del proyecto.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


De acuerdo con el financiamiento el presupuesto total de la institución; este es financiado el 100% con fondos del Tesoro Nacional, evidenciando que el 99% del presupuesto está destinado a la Inversión Productiva, lo que refleja una clara prioridad institucional y respecto a la Formación Bruta de Capital representa el 1% del presupuesto, sin embargo, no se ha ejecutado el presupuesto asignado.

## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

El comportamiento histórico de la ejecución al III trimestre (2022-2026) evidencia que, si bien la institución ha contado con asignaciones presupuestarias variables para inversión, la materialización del gasto durante el tercer trimestre ha sido limitada y, en algunos años, nula. Este patrón sugiere una estacionalidad marcada de la ejecución (concentración en trimestres posteriores) y/o restricciones operativas al inicio de cada ejercicio fiscal, lo que incide en el ritmo de avance físico-financiero y en la capacidad de alcanzar metas anuales con oportunidad.

De acuerdo con el gráfico, la brecha entre el presupuesto vigente y el monto ejecutado al III trimestre se mantiene amplia a lo largo del período, reflejando una baja absorción temprana de recursos. En términos de gestión, esta diferencia representa recursos programados que no se convierten en bienes, obras o servicios durante el segundo corte del año, incrementando la presión para ejecutar en los trimestres siguientes y elevando el riesgo de subejecución o de una ejecución acelerada que afecte la calidad y el control.

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2022 y 2026, basado en los montos vigentes y ejecutados:

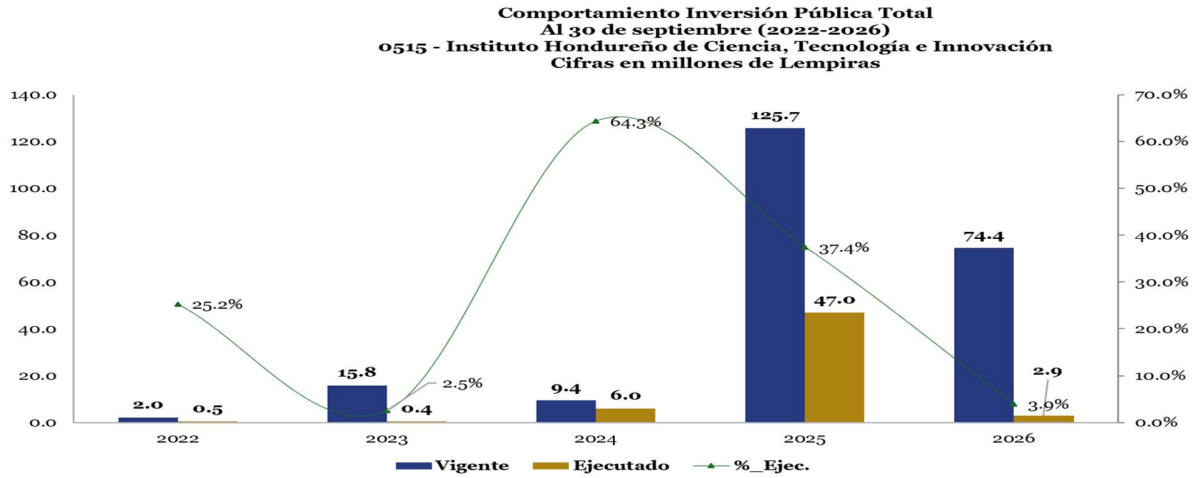


**Fuente:** SIAFI



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## D. PRINCIPALES PROYECTOS

### D.1 El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) cuenta con el proyecto de inversión productiva siguiente:

1. "Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras".

El proyecto de IHCIETI No tuvo actividades físicas ejecutadas durante este período:

Las metas programadas para 2026 son los siguientes:

**Principales Metas Físicas al III trimestre 2026**

| Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III trimestre de 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Capacitación de 540 personas en Ciencia Innovación y Tecnología | Personas | 378 | 0 | 0% | | | 0% |
| Planta Purificadora de Agua (botellones de Agua) | Galones | 3,740 | 0 | 0% | | | 0% |
| Elaboración de suministros de Bioseguridad Alcohol, Cloro, jabón Asisitin | Galones | 3,231 | 0 | 0% | | | 0% |
| Elaborado y entregado 150 prótesis de miembro superior y 5 prótesis de miembro inferior | Prótesis | 75 | 0 | 0% | | | 0% |
| Georreferenciando y reforestando 100 hectáreas de bosque a través de los drones | Hectáreas | 50 | 0 | 0% | | | 0% |
| Adquiridos entregados y 600 equipos tecnológicos ensamblados | Equipo | 104 | 0 | 0% | | | 0% |

**Fuente**: Unidad Ejecutora del proyecto

La ausencia de avances físicos y financieros durante el III trimestre de 2026 obedece a limitaciones institucionales que impidieron la ejecución de actividades, contrataciones y procesos de adquisición.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

### *D.1.1. Evaluación Financiera al III trimestre 2026*

Evaluación Financiera III trimestre 2026

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras | FN-25706-1 | $ 230,163,200 | L 198,343,787 | 20/09/2024 20/09/2026 |
| | **Presupuesto Aprobado** | **Presupuesto Vigente** | **Ejecutado (Devengado)** | **% Ejecución** |
| III trimestre 2026 | 73,106,231.00 | 73,106,231.00 | 2,626,802.77 | 3.99% |
| Acumulado 2026 | 73,106,231.00 | 73,106,231.00 | 2,626,802.77 | 3.9% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 198,343,787 | 198,343,787 | 117,039,867 | 92.0% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### *D.1.2. Principales Adquisiciones al III trimestre 2026*

Durante el III trimestre de 2026 no se registraron adquisiciones en el proyecto, ya que no se realizaron procesos de consultoría, compras menores, licitaciones privadas, licitaciones públicas ni concursos, para el siguiente trimestre se tiene planificado adjudicación de procesos los cuales de detallan a continuación (en etapa de publicación):

- Consultoría de capacitación en tecnología Blockchain
- Servicios de consultoría de monitoreo y evaluación en gestión de proyectos
- Adquisición de drones, equipo y accesorios para uso de IHCIETI
- Adquisición de licencias para uso de IHCIETI
- Adquisición de equipos y suministros para elaboración de prótesis de miembro superior e inferior
- Adquisición de equipo y suministro de fijadores externos
- Adquisición de plataforma para virtualización de cursos STEM en el IHCIETI
- Adquisición de repositorio para el observatorio nacional de ciencia, tecnología e innovación del IHCIETI
- Adquisición de equipo y suministro de realidad virtual, robótica, impresión 3d para el centro nacional de laboratorios y talleres de ciencia y tecnología de IHCIETI



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

- Consultoría: principio y fundamento de IA
- Consultoría Especializada en Ciencia de Datos
- Georreferencia mediante vehículos aéreos drones y capacitación con certificación y licenciamiento de personal técnico.
- Diseño de políticas de acceso a la información y evaluación de mejores prácticas para el departamento de INFOTEC
- Adquisición del equipamiento para laboratorios y talleres (realidad virtual, domótica, micro soldadura) ubicados en las instalaciones de SENACIT/IHCIETI
- Consultoría Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de Suelos en Áreas de Reforestación mediante Tecnologías de Drones y Georreferenciación.
- Capacitación en Realidad Virtual Aplicada al Desarrollo de Experiencias Interactivas e Inmersivas.
- Consultoría de proyecto audiovisuales orientados a Stem.1.

Fuente Unidad Ejecutora reportada en el trimestre anterior

## E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

• Gestiones de asignación de cuota y medicaciones presupuestarias.

Durante el III trimestre de 2026, el proyecto no contó con personal plenamente habilitado para su ejecución operativa, en virtud de las limitaciones administrativas, presupuestarias e institucionales que incidieron en el desarrollo normal de las actividades programadas.

## F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

Durante el III trimestre de 2026, la ejecución del proyecto se vio afectada por factores administrativos y financieros que limitaron el desarrollo de las actividades programadas en el POA. A continuación, se detallan las principales problemáticas identificadas y las acciones de mitigación y gestión realizadas durante el período.

**Problemáticas identificadas**

- Limitaciones institucionales para la coordinación y seguimiento, asociadas a cambios/ausencia temporal de autoridad superior y a la necesidad de fortalecer la gestión interna.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

## G. CONCLUSIONES

- Durante el III trimestre de 2026 no se registró ejecución física ni avance en procesos de compras, contrataciones o consultorías, principalmente por la falta de asignación y disponibilidad presupuestaria.
- Persisten limitaciones institucionales y logísticas (autoridad, coordinación y disponibilidad de espacio físico) que deben atenderse para asegurar la ejecución eficiente de los componentes del proyecto.
- A pesar de la no ejecución, se realizaron acciones técnicas y administrativas de preparación (revisión del POA y levantamiento de requerimientos) que facilitan la reactivación en los trimestres siguientes.

## H. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la coordinación interna y los mecanismos de seguimiento (reuniones periódicas, matriz de control e indicadores), para reducir riesgos de retraso y mejorar la rendición de cuentas.
- Preparar con anticipación los términos de referencia, especificaciones técnicas y documentación de soporte, de manera que al contar con fondos y se inicien de inmediato los procesos de adquisición y contratación.
- Agilizar la ejecución y preparación del cierre del proyecto



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026**
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado III Trimestre | | | | Ejecutado Anual (Devengado) | | | | Compromiso Aprobado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Ejecución (Dev./Vig.) | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total General | % Compromiso (Comp./Vig.) |
| **90** | **1. Inversión Productiva** | | **73,106,231** | **-** | **73,106,231** | **73,106,231** | **-** | **73,106,231** | **2,626,803** | **-** | **2,626,803** | **3.6** | **2,626,803** | **-** | **2,626,803** | **44.6%** | **2,636,003** | **-** | **2,636,003** | **3.6%** |
| **1** | **0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación** | | **73,106,231** | **-** | **73,106,231** | **73,106,231** | **-** | **73,106,231** | **2,626,803** | **-** | **2,626,803** | **3.6%** | **2,626,803** | **-** | **2,626,803** | **3.6%** | **2,636,003** | **-** | **2,636,003** | **3.6%** |
| 1 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT/IHCIETI PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRADOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE HONDURAS | FN-25706-1 | 73,106,231 | - | 73,106,231 | 73,106,231 | - | 73,106,231 | 2,626,803 | - | 2,626,803 | 3.6% | 2,626,803 | - | 2,626,803 | 3.6% | 2,636,003 | - | 2,636,003 | 3.6% |
| | **TOTAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT /IHCIETI PARA BRINDAR SERVICI** | | **73,106,231** | **-** | **73,106,231** | **73,106,231** | **-** | **73,106,231** | **2,626,803** | **-** | **2,626,803** | **3.6%** | **2,626,803** | **-** | **2,626,803** | **3.6%** | **2,636,003** | **-** | **2,636,003** | **3.6%** |
| | **2. Formación Bruta de Capital Fijo** | | **300,000** | **-** | **300,000** | **1,320,000** | **-** | **1,320,000** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** |
| | **0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación** | | **300,000** | **-** | **300,000** | **1,320,000** | **-** | **1,320,000** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** |
| | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | 300,000 | - | 300,000 | 1,320,000 | - | 1,320,000 | 268,200 | - | 268,200 | 20.3% | 268,200 | - | 268,200 | 20.3% | 268,200 | - | 268,200 | 20.3% |
| | **TOTAL - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO** | | **300,000** | **-** | **300,000** | **1,320,000** | **-** | **1,320,000** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** | **268,200** | **-** | **268,200** | **20.3%** |
| | **Total general** | | **73,406,231** | **-** | **73,406,231** | **74,426,231** | **-** | **74,426,231** | **2,895,002** | **-** | **2,895,002** | **22.0%** | **2,895,002** | **-** | **2,895,002** | **1** | **2,904,202** | **-** | **2,904,202** | **3.9%** |

***Nota:*** SIAFI, 30/09/2026



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

# ANEXO 2

**ANEXO No.2**
**SECRETARÍA DE FINANZAS**
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026**

| Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | III trimestre de 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Capacitación de 540 personas en Ciencia Innovación y Tecnología | Personas | 378 | 0 | 0% | | | 0% |
| Planta Purificadora de Agua (botellones de Agua) | Galones | 3,740 | 0 | 0% | | | 0% |
| Elaboración de suministros de Bioseguridad<br>Alcohol, Cloro, jabón Asisitin | Galones | 3,231 | 0 | 0% | | | 0% |
| Elaborado y entregado 150 prótesis de miembro superior y 5 prótesis de miembro inferior | Prótesis | 75 | 0 | 0% | | | 0% |
| Georreferenciando y reforestando 100 hectáreas de bosque a través de los drones | Hectáreas | 50 | 0 | 0% | | | 0% |
| Adquiridos entregados y 600 equipos tecnológicos ensamblados | Equipo | 104 | 0 | 0% | | | 0% |

Actualizado al 30 de junio 2026 ya que no se recibió informe por parte de la institución.



AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
