SECRETARÍA
DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Registro Nacional de las Personas (RNP)

Informe No. 0180-003-2026

Tegucigalpa, Octubre 2026

Contenido

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 4
D. PRINCIPALES PROYECTOS 5
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre del 2026 6
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 8
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026 8
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 8
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 9
G. CONCLUSIONES 9
H. RECOMENDACIONES 10
ANEXO 1 12
ANEXO 2 13

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Registro Nacional de las Personas (RNP) es la institución responsable de registrar los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas naturales, desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Asimismo, tiene a su cargo la identificación de la población hondureña y la emisión del Documento Nacional de Identificación (DNI) para todos los ciudadanos del país.

Al cierre del tercer trimestre del 2026, la institución contó con un presupuesto aprobado de L282.0 millones y un presupuesto vigente de L282.0 millones para la ejecución de proyectos de inversión pública, distribuidos en inversión productiva y formación bruta de capital. Del presupuesto vigente, en el trimestre se ejecutaron L26.6 millones, equivalentes a una ejecución de 9.4%.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**282,039,186**
Inversión Productiva	185,860,518
Formación Bruta de Capital	96,178,668
Presupuesto Vigente	**282,249,682**
Inversión Productiva	185,860,518
Formación Bruta de Capital	96,389,164
Ejecutado III Trimestre	**26,607,039**
Inversión Productiva	2,982,812
Formación Bruta de Capital	23,624,227
% Ejecución (Ejecutado III Trim-2026/Vigente)	**9.4%**
Ejecutado Anual	**51,698,837**
Inversión Productiva	7,051,582
Formación Bruta de Capital	44,647,254
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**18.3%**
Compromiso Aprobado	**54,379,439**
Inversión Productiva	9,580,231
Formación Bruta de Capital	44,799,208
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/Vigente)	**19.3%**


Nota: SIAFI, 30/09/2026

Del monto ejecutado, L2.9 millones corresponden a inversión productiva y L23.6 millones a formación bruta de capital, evidenciando una mayor concentración del gasto en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional. En cuanto al compromiso presupuestario, este alcanzó igualmente L54.4 millones (que incluye Inversión Productiva y Formación Bruta de Capital), representando el 19.3% del presupuesto vigente, conforme a la información presentada en el Cuadro No. 01.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El RNP financia sus programas y proyectos a través de dos fuentes de financiamiento (Tesoro Nacional y Crédito Externo). Del presupuesto vigente al tercer trimestre del 2026, la principal fuente de financiamiento es del Crédito Externo con L185.9 millones, seguido de Fondos Nacionales (Tesoro Nacional y Fondos Propios) con L96.4 millones, evidenciando una estructura de financiamiento orientada tanto al fortalecimiento institucional como a la ejecución de proyectos estratégicos de inversión pública, como se muestra en el cuadro No.1.

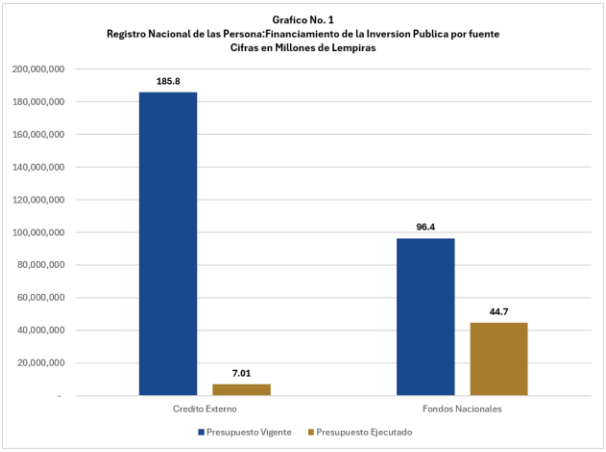

Fuente: SIAFI

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado de las inversiones del Registro Nacional de las Personas (RNP) al cierre del tercer trimestre entre los años 2022 a 2026:


- En 2022, el presupuesto vigente ascendió a L87.1 millones, de los cuales se ejecutaron L7.6 millones, alcanzando una ejecución de 8.7%. Este comportamiento refleja un bajo nivel de ejecución asociado principalmente a actividades de cierre y compromisos administrativos vinculados a proyectos ejecutados en períodos anteriores.
- Para el 2023, el presupuesto vigente se incrementa significativamente a L500.1 millones; de los cuales se ejecutaron L450.9 millones, equivalentes a 90.2%, registrando en ese año la ejecución más alta del período en revisión.
- En el 2024, el presupuesto vigente ascendió a L100.2 millones, registrándose una ejecución de L58.2 millones, equivalentes al 58.1%. Estos recursos continúan relacionados con actividades complementarias y procesos derivados del Proyecto “Identifícate”, mostrando una mejora relativa en la capacidad de ejecución institucional respecto a los años previos.
- Al tercer trimestre del 2025, el presupuesto vigente ascendió a L481.3 millones y la ejecución alcanzó L71 millones, equivalentes a 14.8%, reflejando un bajo nivel de avance financiero en relación con los recursos programados, condicionado por procesos administrativos, contractuales y cronogramas de ejecución física vinculados a las intervenciones institucionales en materia de identificación ciudadana.
- Al tercer trimestre de 2026, el presupuesto vigente se ubica en L 282.2 millones, con una ejecución de L51.7 millones, equivalente a 18.3%. Aunque el nivel de ejecución continúa

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

siendo moderado, se observa un comportamiento igual registrado en 2025, evidenciando avances iniciales en la implementación de las actividades y proyectos institucionales.

Gráfico No. 02

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0180 - Registro Nacional de las Personas
Cifras en millones de Lempiras

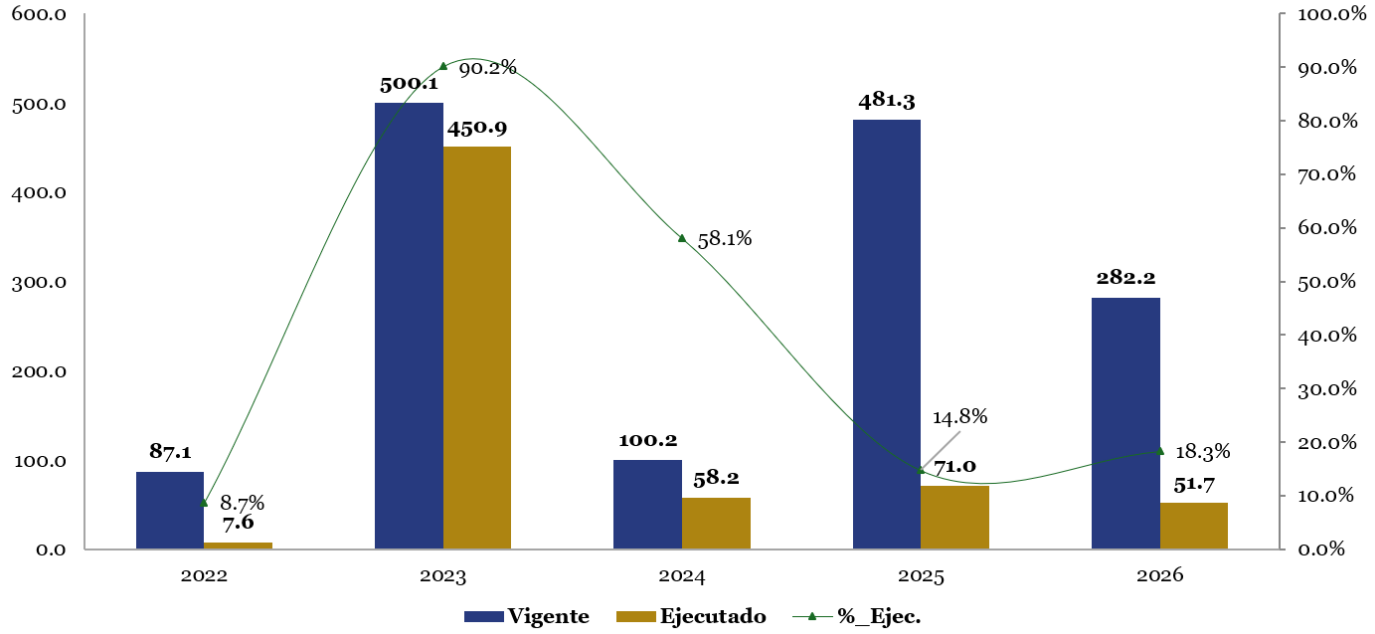

Fuente: SIAFI

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva al tercer trimestre del 2026 se concentra en el Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificación en Honduras.

El objetivo fundamental del proyecto es garantizar que toda persona cuente oportunamente con su registro de nacimiento desde la primera infancia y en el caso de la población mayor de edad, con su documento nacional de identificación, priorizando especialmente a la población entre 6 y 17 años. Lo anterior busca asegurar el acceso efectivo a derechos fundamentales como educación, salud, protección social y demás servicios públicos y privados, contribuyendo a reducir los niveles de exclusión social, fortalecer la inclusión ciudadana y promover mayores condiciones de equidad y desarrollo humano en el país.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre del 2026

Al cierre del tercer trimestre del 2026, el Proyecto registra avances financieros de L7.01 millones, lo que refleja el desfase en el inicio de la ejecución de actividades programadas para el presente ejercicio fiscal. En cuanto a los avances físicos, estos corresponden principalmente a la planificación operativa, coordinación interinstitucional y desarrollo de acciones preparatorias orientadas a la implementación de las actividades contempladas en el Proyecto, sentando las bases para su ejecución en los siguiente trimestre del año.

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Program.	Ejecución	% Ejec	Program.	Ejecución	% Ejec
0180 - Registro Nacional de las Personas								
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.	Niños Niñas y Adolescentes6-17 años (NNA) identificados.	Persona	1,500,000	84,404	6%	446,552	84,404	18.9%
	Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	Centro Municipal	205	-	0%	205	-	0%
	Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	Persona	1,500	753	50.2%	650	419	64.46%
	Estrategia de Ciberseguridad elaborada	Estrategia	1	-	0%	1.00	-	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.

Resumen de principales actividades realizadas en el trimestre

Componente 1: Mejora de la cobertura del registro civil e identificación de menores. Durante el tercer trimestre el 25 de septiembre se emitió la orden de inicio de la consultoría para diseñar el sistema de registro de nacimientos y la arquitectura de interoperabilidad entre la Secretaría de Salud (SESAL) y el RNP. Continuó el enrolamiento de NNA de 6 a 17 años en el Distrito Central y San Pedro Sula, con 84,040 enrolamientos reportados en el gráfico de julio a septiembre. Se desarrollaron actividades de socialización territorial y se difundió el formulario digital para identificar casos de subregistro. La capacitación del personal de campo alcanzó un acumulado de 879 personas: 753 reportadas en 2026 y 126 en 2025. El cuadro de contratación registra 295 personas contratadas, con fecha de corte pendiente de confirmación. La validación de registros, la emisión y la entrega del Documento de Identificación Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes (DINNA) corresponden a etapas posteriores al enrolamiento.

Componente 2: Modernización de los servicios de registro civil e identificación digital. Durante el tercer trimestre Se elaboraron y concertaron términos de referencia (TdR) para fortalecer el Sistema de Identificación Nacional (SIN), mediante consultorías especializadas en Oracle Cloud Infraestructura (OCI), arquitectura de nube, migración de datos, administración de bases de datos, y seguridad y operación tecnológica. También se reformuló la propuesta de interoperabilidad y se avanzó en los preparativos para su contratación. Se prepararon los TdR de atención ciudadana y peticiones, quejas y reclamos (PQR), así como una propuesta del mecanismo institucional de atención, pendiente de validación. El informe reporta la publicación del proceso de adquisición de kioscos, cuyo estado al cierre del trimestre requiere confirmación. El registro de bienes recibidos alcanzó 12,297 unidades acumuladas, incluidas 724 ingresadas durante julio a septiembre. Se reportó la distribución de 40 fotocopiadoras "Ricoh" y la asignación territorial de 2,472 unidades: 2,331 para los Centros de Registro Municipal (RCM) y 141 para Oficialías.

Estas cifras corresponden a bienes recibidos o asignados y no al número de centros modernizados.

Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del RNP. A partir del diagnóstico institucional previo, se prepararon los TdR de tres consultorías sobre marco legal, gobernanza y modernización institucional. Se avanzó en las guías de servicios institucionales y consulares, y se concluyeron los TdR de gestión del cambio, pendientes de revisión final y aprobación. Se reportó la puesta en funcionamiento del Mecanismo de Atención al Ciudadano (MAC) para atender consultas, quejas y reclamos relacionados con la identificación de NNA. La consultoría de ciberseguridad se ajustó para contratar una firma especializada e incorporar el diseño del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC); sus TdR requieren aprobación para continuar con la selección. Se iniciaron las gestiones de adquisición de soporte, licencias, protección de dispositivos y herramientas de administración tecnológica para fortalecer el centro de datos. También se reportó la actualización de Moodle a la versión 5.1, cuya versión y fecha de instalación requieren confirmación, y se avanzó en las especificaciones para equipar los laboratorios de capacitación y adquirir el compendio de leyes destinado a los RCM, pendientes de validación, aprobación o contratación, según corresponda.

Al cierre de septiembre, el Proyecto combina actividades operativas de identificación con intervenciones que aún requieren diseño, aprobación o contratación. Las prioridades son continuar el despliegue territorial, resolver las aprobaciones pendientes y coordinar las dependencias entre componentes. El plan de acción concentra las gestiones del cuarto trimestre de 2026 y prevé su continuidad gradual en los períodos siguientes, conforme a la programación actualizada del Proyecto.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se muestra la ejecución financiera histórica del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras al tercer trimestre del 2026:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.	AF-7471-HN	US$	$40,000,000	23/02/2024-26/08/2027
		Lempiras	L1,068,732,000	
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	185,860,518	185,860,518	2,982,812.3	1.6%
Acumulado 2026	185,860,518	185,860,518	7,051,582.4	3.8%
Acumulado Vida del Proyecto*	1,068,732,000	1,068,732,000	845,909,293.03	79.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre del 2026

No se registraron adquisiciones durante el III Trimestre del 2026 en el marco del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el III Trimestre del 2026, la gestión de la inversión del Registro Nacional de las Personas (RNP) se orientó a consolidar las condiciones técnicas, operativas, administrativas y fiduciarias necesarias para acelerar la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras (Convenio de Préstamo IDA 7471-HN).

- Se desarrollaron reuniones técnicas y mesas de trabajo con la Secretaría de Salud (SESAL), orientadas a reactivar y fortalecer los acuerdos necesarios para la automatización del registro de nacidos vivos y el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad entre ambas instituciones.
- Se realizaron reuniones técnicas y de seguimiento con representantes del Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), orientadas a revisar el avance del Proyecto, dar seguimiento a la ejecución financiera y operativa, validar prioridades de implementación y coordinar acciones relacionadas con adquisiciones, planificación y cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de Préstamo IDA 7471-HN.
- Durante el trimestre, la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) realizó gestiones de acompañamiento y seguimiento en apoyo al Proyecto. Entre ellas, participó en reuniones técnicas y mesas de trabajo con la Secretaría de Salud (SESAL), orientadas a reactivar y fortalecer los acuerdos necesarios para la automatización del registro de nacidos vivos y el establecimiento de mecanismos de interoperabilidad entre ambas instituciones.

- Asimismo, la DGIP participó en reuniones técnicas y de seguimiento con representantes del Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), con el propósito de revisar el avance del Proyecto, dar seguimiento a la ejecución financiera y operativa, validar prioridades de implementación y coordinar acciones relacionadas con adquisiciones, planificación y cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de Préstamo IDA 7471-HN.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

Durante el III Trimestre del 2026 se identificaron situaciones que han incidido en el ritmo de ejecución del proyecto, principalmente asociadas a condiciones externas, dependencias técnicas y requerimientos de coordinación interinstitucional. En respuesta, la Unidad Implementadora de Proyectos del RNP impulsó acciones correctivas y de mitigación orientadas a asegurar la continuidad y aceleración de la inversión en los siguientes períodos.

- La implementación no ha iniciado. Depende de la consultoría de diseño y de la arquitectura de interoperabilidad SESAL–RNP, que definirán los requisitos funcionales, tecnológicos y de contratación.
- Elaborar un plan de capacitación preliminar. Reservar tiempo suficiente antes de la puesta en funcionamiento.
- Siguen en preparación y validación. Falta definir el modelo de atención y completar las contrataciones.
- Cerrar el modelo de atención. Acelerar las contrataciones. Unificar los procedimientos de recepción y seguimiento de solicitudes.
- Falta completar la sistematización de los servicios y su articulación con la automatización.
- Terminar la sistematización. Iniciar el borrador del marco legal en paralelo con las soluciones tecnológicas.
- Contratar sin más demora. Asegurar el acompañamiento al personal antes de que entren en operación los nuevos procesos.

G. CONCLUSIONES

- Al cierre del III trimestre del 2026, el RNP presenta una ejecución de 18.3% del presupuesto vigente, lo que evidencia un inicio lento en la ejecución de la inversión pública, asociado principalmente a actividades preparatorias, procesos de planificación y ajustes técnicos.
- En términos generales, el Proyecto avanza de la preparación a la operación. Durante el trimestre continuó el enrolamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) de 6 a 17 años en el Distrito Central y San Pedro Sula, con 84,040 enrolamientos reportados entre julio y septiembre. En paralelo se consolidaron las bases técnicas, tecnológicas e institucionales para la implementación nacional: términos de referencia (TdR), equipamiento, capacitación del personal de campo (879 personas capacitadas, acumulado de 2025 y

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

2026) y coordinación interinstitucional. El informe prevé completar la contratación del personal restante a finales de octubre de 2026.

- Se registran avances relevantes en la fase preparatoria. Se elaboraron y concertaron TdR para fortalecer el Sistema de Identificación Nacional (SIN) sobre Oracle Cloud Infrastructure (OCI), para la atención ciudadana y las peticiones, quejas y reclamos (PQR), para el marco legal y la gobernanza, y para la gestión del cambio. Se reformuló la propuesta de interoperabilidad y se integró el diseño del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en la consultoría de ciberseguridad. Varios de estos documentos siguen pendientes de aprobación del Pleno de Comisionados antes de publicarse y contratarse.
- Se registran avances concretos en la implementación operativa. El 25 de septiembre se emitió la orden de inicio de la consultoría para diseñar el sistema de registro de nacimientos y la arquitectura de interoperabilidad entre la Secretaría de Salud (SESAL) y el RNP. Se puso en funcionamiento el Mecanismo de Atención al Ciudadano (MAC) por WhatsApp, teléfono y correo, se avanzó en la conformación del equipo de comunicaciones y se difundió el formulario de subregistro a las 298 oficinas de los registros civiles municipales. También continuaron la recepción y distribución de bienes para los centros de atención (12,297 unidades acumuladas, 724 de ellas en el trimestre) y las acciones de fortalecimiento del centro de datos.
- Los componentes de transformación e identificación digitales continúan principalmente en planificación y estructuración. Dependen de TdR por aprobar, consultorías por contratar y diagnósticos por completar, que definirán los modelos tecnológicos, operativos y normativos. Esto afecta también a productos posteriores: la capacitación de nacidos vivos, los manuales de verificación y autenticación (previstos para 2027) y el marco legal.
- El fortalecimiento institucional es un eje transversal del Proyecto. Incluye gobernanza, gestión del cambio, ciberseguridad, protección de datos personales, interoperabilidad, capacitación (actualización de Moodle a la versión 5.1, pendiente de confirmar) y modernización tecnológica. Estos elementos contribuirán a la sostenibilidad de las inversiones y a la continuidad de los servicios.

H. RECOMENDACIONES

- Pasar de la preparación a la ejecución territorial. Ampliar el enrolamiento más allá del Distrito Central y San Pedro Sula, y completar la contratación del personal de campo (295 contratadas de 879 capacitadas), para mejorar el nivel de ejecución física y financiera. Mantener la coordinación de equipos, conectividad y transporte con el despliegue.
- Resolver las aprobaciones pendientes. Gestionar ante el Pleno de Comisionados, con un calendario definido, los TdR y las especificaciones técnicas pendientes (Oracle/OCI, ciberseguridad y SOC, marco legal y gobernanza, gestión del cambio, laboratorios de capacitación y compendio de leyes), para que avancen la publicación y la contratación.
- Consolidar acuerdos y seguimiento con la SESAL. Dar seguimiento al informe de avance de la consultoría (previsto a finales de octubre) y establecer acuerdos vinculantes y mecanismos de seguimiento operativo con la SESAL. Así se reduce la dependencia de

cambios administrativos y se asegura la continuidad del sistema de registro de nacidos vivos y de la interoperabilidad.

- Poner en marcha la reducción del subregistro. Consolidar y validar la base de datos del formulario, priorizar los territorios y programar las brigadas móviles. Presentar la solicitud de amnistía registral al Congreso Nacional y completar el perfil y los TdR de los abogados de apoyo.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional. Facilitar la interoperabilidad de los sistemas, la implementación de los nuevos servicios digitales y la articulación con iniciativas afines, como la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), para evitar duplicidades.
- Continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica y la ciberseguridad. Avanzar en la adquisición e instalación de soluciones de respaldo, licencias, protección de dispositivos (EDR) y herramientas de administración del centro de datos. Articular los requerimientos de ciberseguridad, protección de datos y diseño del SOC, para garantizar la continuidad operativa y la protección de la información.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
90	**1. Inversión Productiva**		**-**	**185,860,518**	**185,860,518**	**-**	**185,860,518**	**185,860,518**	**-**	**2,982,812**	**2,982,812**	**1.6%**	**-**	**7,051,582**	**7,051,582**	**3.8%**	**-**	**9,580,231**	**9,580,231**	**5.2%**
1	**0180 - Registro Nacional de las Personas**		**-**	**185,860,518**	**185,860,518**	**-**	**185,860,518**	**185,860,518**	**-**	**2,982,812**	**2,982,812**	**1.6%**	**-**	**7,051,582**	**7,051,582**	**3.8%**	**-**	**9,580,231**	**9,580,231**	**5.2%**
1	Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras	AF-7471-HN	-	185,860,518	185,860,518	-	185,860,518	185,860,518	-	2,982,812	2,982,812	1.6%	-	7,051,582	7,051,582	3.8%	-	9,580,231	9,580,231	5.2%
	TOTAL - Proyecto Fortalecimiento del Ecosistema Nacional de Registros Civil e Identificacion en Honduras		**-**	**185,860,518**	**185,860,518**	**-**	**185,860,518**	**185,860,518**	**-**	**2,982,812**	**2,982,812**	**1.6%**	**-**	**7,051,582**	**7,051,582**	**3.8%**	**-**	**9,580,231**	**9,580,231**	**5.2%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		**96,178,668**	**-**	**96,178,668**	**96,389,164**	**-**	**96,389,164**	**23,624,227**	**-**	**23,624,227**	**24.5%**	**44,647,254**	**-**	**44,647,254**	**46.3%**	**44,799,208**	**-**	**44,799,208**	**46.5%**
	0180 - Registro Nacional de las Personas		**96,178,668**	**-**	**96,178,668**	**96,389,164**	**-**	**96,389,164**	**23,624,227**	**-**	**23,624,227**	**24.5%**	**44,647,254**	**-**	**44,647,254**	**46.3%**	**44,799,208**	**-**	**44,799,208**	**46.5%**
	ACTIVIDADES CENTRALES		96,178,668	-	96,178,668	96,389,164	-	96,389,164	23,624,227	-	23,624,227	24.5%	44,647,254	-	44,647,254	46.3%	44,799,208	-	44,799,208	46.5%
	TOTAL - ACTIVIDADES CENTRALES		**96,178,668**	**-**	**96,178,668**	**96,389,164**	**-**	**96,389,164**	**23,624,227**	**-**	**23,624,227**	**24.5%**	**44,647,254**	**-**	**44,647,254**	**46.3%**	**44,799,208**	**-**	**44,799,208**	**46.5%**
	Total general		**96,178,668**	**185,860,518**	**282,039,186**	**96,389,164**	**185,860,518**	**282,249,682**	**23,624,227**	**2,982,812**	**26,607,039**	**9.4%**	**44,647,254**	**7,051,582**	**51,698,837**	**18.3%**	**44,799,208**	**9,580,231**	**54,379,439**	**19.3%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública-Direccion General de Inversiones Publicas

PLAN DE INVERSION PUBLICA, EJECUCION FISICA 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Program.	Ejecución	% Ejec	Program.	Ejecución	% Ejec
0180 - Registro Nacional de las Personas								
Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema Nacional del Registro Civil e Identificación de Honduras.	Niños Niñas y Adolescentes6-17 años (NNA) identificados.	Persona	1,500,000	84,404	6%	446,552	84,404	18.9%
	Centros Municipales equipados con kit biométrico y computadora.	Centro Municipal	205	-	0%	205	-	0%
	Personas Capacitadas para la identificación NNA 6-17 años	Persona	1,500	753	50.2%	650	419	64.46%
	Estrategia de Ciberseguridad elaborada	Estrategia	1	-	0%	1.00	-	0%

Fuente Unidad Ejecutora

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
