SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe al III Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS)

Informe No. 0400-003-2026

Tegucigalpa, Octubre 2026

Contenido

Contenido 2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026) 5
D. PRINCIPALES PROYECTOS 6
D.1 Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras (AAH) 6
D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026 9
D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026 9
D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026 10
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 10
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026 11
G. CONCLUSIONES 11
H. RECOMENDACIONES 11
ANEXO 1 12
ANEXO 2 13

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Administración Aduanera de Honduras (AAH), conocida también como Aduanas Honduras, es la institución pública, técnica, que se encarga de la seguridad nacional en zonas fronterizas y es responsable de administrar y controlar el sistema aduanero del país.

Su labor se centra en regular el ingreso, salida y tránsito de mercancías, recaudar los tributos aduaneros y facilitar el comercio legítimo, contribuyendo a la seguridad y al desarrollo económico nacional.

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) tiene como misión fortalecer la recaudación tributaria, contribuir a la seguridad nacional e impulsar el crecimiento económico mediante procesos y controles aduaneros eficientes, innovadores, ágiles y transparentes. Su visión es consolidarse como una administración aduanera moderna, eficiente y referente en la región, sustentada en estándares internacionales y en un talento humano íntegro y altamente calificado.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	**344,560,898**
Inversión Productiva	261,270,015
Formación Bruta de Capital	83,290,883
Presupuesto Vigente	**344,560,898**
Inversión Productiva	261,270,015
Formación Bruta de Capital	83,290,883
Ejecutado III Trimestre	**59,991,905**
Inversión Productiva	59,964,386
Formación Bruta de Capital	27,520
% Ejecución (Ejecutado III Trim-	**17.4%**
Ejecutado Anual	**67,281,208**
Inversión Productiva	67,253,688
Formación Bruta de Capital	27,520
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	**19.5%**
Compromiso Aprobado	**112,030,838**
Inversión Productiva	112,001,516
Formación Bruta de Capital	29,322
% Compromiso (Compromiso III Trim-2026/ Vigente)	**32.5%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

Entre sus principales funciones se encuentran el control y la fiscalización aduanera de las operaciones de comercio exterior; la recaudación de tributos aduaneros; la prevención y combate a la defraudación y otros ilícitos mediante una adecuada gestión de riesgos; la facilitación del comercio, promoviendo procesos que agilicen el despacho de mercancías; y la modernización institucional, a través de la digitalización y automatización de los servicios para fortalecer la eficiencia y la trazabilidad de las operaciones.

En los últimos años, la institución ha impulsado un proceso de reforma y transformación aduanera 2023–2026, orientado a consolidar una aduana moderna, eficiente, segura y transparente, con mejoras en tecnología, infraestructura, gestión de riesgos y fortalecimiento normativo, con apoyo de cooperación técnica internacional.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, la Administración Aduanera de Honduras contó con un presupuesto aprobado y vigente para inversión pública de **L344.6 millones,** de los cuales L261.3 millones corresponden a inversión productiva y L83.3 a la formación bruta de capital fijo. La ejecución

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

presupuestaria en el tercer trimestre asciende a L60.0 millones representando el 89.2% de la ejecución acumulada, representada principalmente por la Inversión Productiva; mientras que la ejecución del trimestre fue de L67.3 millones, equivalente al 19.5 % del Presupuesto Vigente tal como se detalla en el Cuadro No.1.


La ejecución productiva se realizó mediante un proyecto de inversión pública enfocado en el fortalecimiento institucional y operativo de la administración aduanera, promoviendo la gobernanza institucional en el marco de la transformación digital, ampliando la capacidad operativa y modernizando los sistemas, las estrategias y la infraestructura tecnológica.

Mientras que la formación bruta de capital fijo se identifica en el Programa 11 de la Administración Aduanera para la adquisición de muebles y equipos varios de oficina, electrodomésticos, equipo de comunicación y aplicaciones informáticas necesarias para la operatividad de las aduanas.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, al tercer trimestre 2026, se constata según fuente SIAFI, que está compuesta por un 24.2% del presupuesto que corresponde a Fuente 12 Recursos propios (L83.3 millones), utilizados para financiar la formación bruta de capital; mientras que un 75.8% del presupuesto vigente corresponde a la Fuente 21, Crédito Externo (L261.3 millones) que integran la Inversión Productiva.

Gráfico No. 01
ADUANAS: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

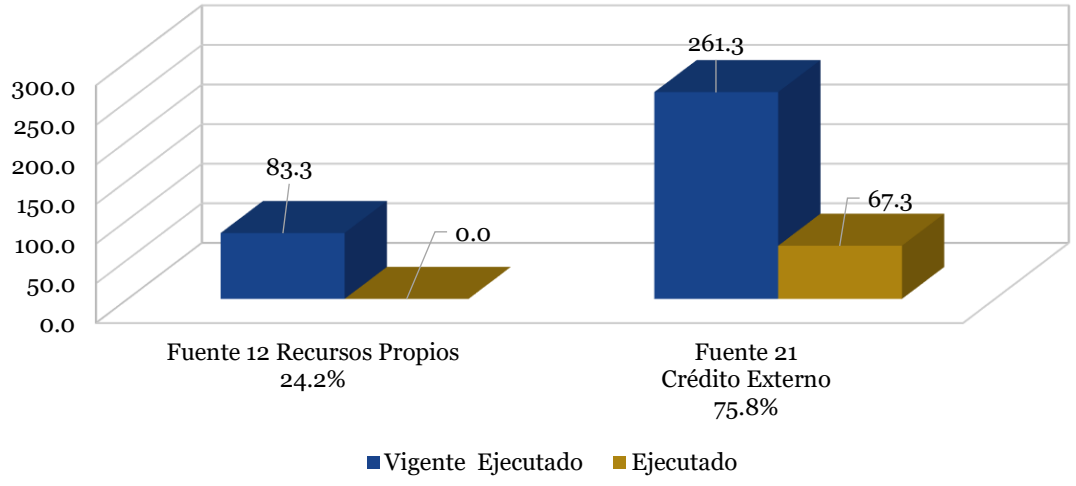

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2022-2026)


En el Gráfico No.02 se evidencia que, para el período de ejecución al tercer trimestre 2022–2026, la inversión pública alcanzó en 2025 el mayor nivel de ejecución del período, con L. 78.3 millones, equivalente al 29.3% del presupuesto vigente; siguiéndole la gestión 2026 con una ejecución de L67.3 millones, representando el 19.5% de su presupuesto vigente; sin embargo, en 2023 la ejecución es la más baja con 8.1 %, reflejando un bajo nivel de avance durante el año. En 2024 el presupuesto vigente aumentó con una ejecución de L40.8 millones, equivalente al 14.1 % del presupuesto vigente, mostrando una recuperación respecto al 2022 y 2023.

Aunque en 2026 se observa una desaceleración en la ejecución, es importante mencionar que esta se debe a que los contratos que trascienden periodo de Gobierno fueron aprobados por el Congreso Nacional a finales del primer semestre del año.

En conjunto, los datos reflejan una baja materialización financiera frente a los recursos programados, ejecución que se ha visto afectada por factores externos como la transición de período gubernamental y la aprobación del presupuesto hasta abril 2026; por lo anterior se sugiere fortalecer la planificación operativa, acelerar la reformulación de la inversión productiva que se encuentra en proceso para acelerar el cumplimiento de los objetivos planteados tanto por el proyecto de inversión pública como por la formación bruta de capital fijo.

Gráfico No. 02

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de septiembre (2022-2026)
0400 - Administración Aduanera de Honduras
Cifras en millones de Lempiras

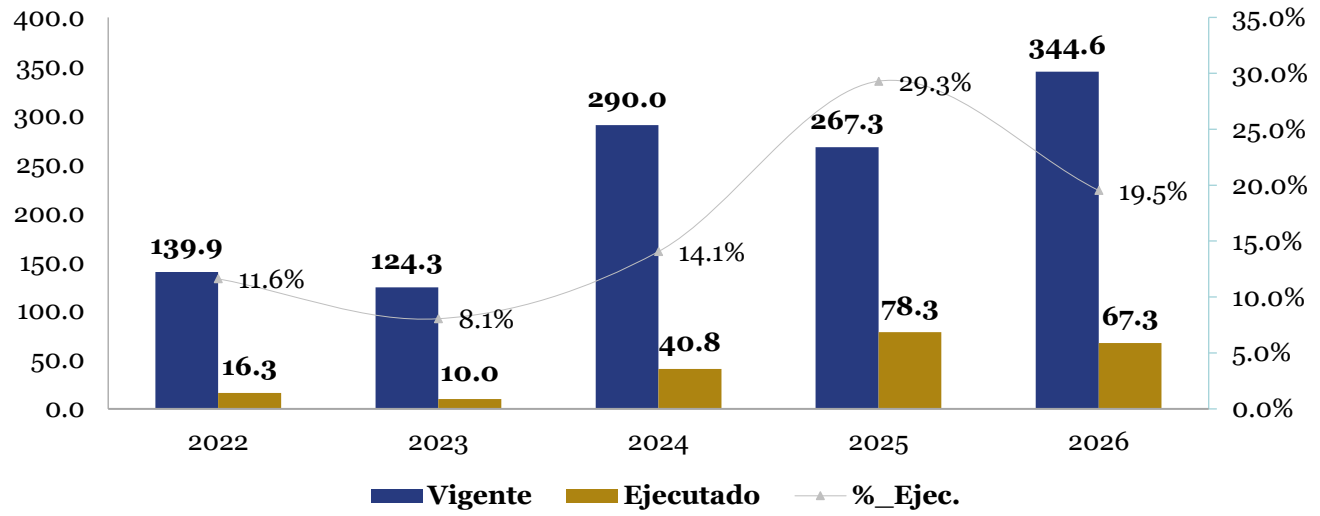

Fuente: SIAFI

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D. PRINCIPALES PROYECTOS

ADUANAS ejecuta un proyecto de inversión pública con Nota de Prioridad No.25118-1 y cuenta con financiamiento de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 5694/BL/HO); el proyecto "Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera" tiene como objetivo general aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de procesos, la implementación de controles y el uso de tecnologías que faciliten el comercio y contribuyan a disminuir la defraudación fiscal. En términos de resultados de desarrollo, busca: (i) incrementar la eficiencia de la gestión operativa de ADUANAS; y (ii) mejorar los controles, la automatización y el uso de tecnologías para facilitar el comercio y reducir la defraudación fiscal.

D.1 Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras (AAH)

Con base en la información reportada en el Informe de Seguimiento Físico-Financiero correspondiente al III Trimestre de 2026 del Proyecto "Fortalecimiento Institucional y Operativo de la administración Aduanera" presentado por ADUANAS, se presenta a continuación una síntesis de las principales actividades físicas desarrolladas por componentes, en función del estado de avance de los procesos de consultoría, adquisiciones, fortalecimiento institucional, modernización tecnológica y gestión del proyecto.

Componente 1. Fortalecimiento de la Gestión y Gobernanza Institucional en un Marco de Transformación Digital.

Modernización de la Ley de Aduanas de Honduras y su Reglamento: durante el trimestre reportado, la Dirección Ejecutiva realizó la revisión y los ajustes a los Términos de Referencia (TDR) de la consultoría; y para el siguiente trimestre, se prevé publicar el proceso e iniciar su ejecución.

Estrategia y Modelo de Gestión de Recursos Humanos con Enfoque de Equidad de Género y Diversidad: se otorgó la no objeción al informe de evaluación para la conformación de la lista corta de consultores y para el siguiente trimestre, se espera avanzar a la etapa de evaluación combinada de las propuestas técnicas y económicas, considerando la calidad y el costo.

Implementación de la Estrategia de Integridad Institucional y de Gestión del Cambio: durante el tercer trimestre, se publicó la invitación para la presentación de ofertas y se espera adjudicar el proceso y realizar la entrega de los equipos. Además, sobre las giras de capacitación y socialización en las aduanas**,** se realizaron jornadas dirigidas a los colaboradores en la zona norte, que incluyeron la Aduana y Guardatura de La Mesa, la Oficina Regional de San Pedro Sula, Corinto y Puerto Cortés. Asimismo, en la zona sur se visitaron las aduanas de El Amatillo, Henecán, Guasaule y La Fraternidad. Para el siguiente trimestre, se prevé continuar con estas actividades en las aduanas de las zonas atlántica, occidental y central.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Componente 2. Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Control y del Cumplimiento Aduanero.

Reingeniería de Procesos: se continuó la ejecución del contrato y se recibió el sexto producto, denominado "Cuarto paquete de procesos y subprocesos terminados"; se estima para el siguiente trimestre, la entrega del séptimo producto, correspondiente al "Informe final de la primera etapa".

Paso Integrado de Corinto y las Manos: durante el mes de julio se realizó una gira a Las Manos para el levantamiento de información relacionada con la medición de tiempos de despacho y brindar acompañamiento en aspectos socioambientales, conforme a los requisitos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También, se compartió con el BIS los resultados de la medición de tiempos de despacho realizada en la Aduana de Corinto.

Sistema de Gestión Integral de Riesgo (SGIR): se otorgó la no objeción al informe de evaluación para la conformación de la lista corta de consultores y se invitó a las empresas seleccionadas a presentar sus ofertas técnicas y económicas. Es importante mencionar que, debido al elevado número de consultas recibidas durante el proceso, se amplió el plazo para la presentación de ofertas, por lo tanto, se espera que, para el siguiente trimestre se realice la apertura pública de las propuestas y avanzar a la etapa de evaluación combinada.

Laboratorio Aduanero – Suministros e insumos: para el proceso de Adquisición de suministros, insumos y materiales de reposición periódica, se recibieron las ofertas, al momento de cierre del presente informe la comisión de evaluación estaba realizando el análisis de las ofertas. Para el siguiente trimestre se espera realizar la adjudicación y entrega de los materiales

Servicios de calibración y manejo de desechos tóxicos: el proceso se declaró desierto; por lo tanto, se llevó a cabo reunión entre el BID y la UEP para revisar la modalidad de contratación para un nuevo proceso, se acordó indagar sobre tipos de proceso a utilizar, esperando iniciar el nuevo proceso el próximo semestre.

Componente 3. Modernización y Resiliencia de la Plataforma Tecnológica con Énfasis en la Seguridad de la Información.

La Consultoría para la **Actualización de la Arquitectura Tecnológica del SARAH y PECH** continuó su ejecución con la entrega de:

- Producto 3, Arquitectura Tecnológica Definición, y
- Producto 2, Framework de Desarrollo.

Es preciso mencionar que la parte técnica de la Gerencia de Tecnología de Aduanas realizó comentarios ambos productos y al momento del cierre del presente informe está programada la reunión entre Aduanas y la empresa IDEATI para revisar y solventar las diferencias y correcciones.

En la actividad Adquisición de equipo Ofimático para Administración Aduanera (Impresoras de Inyección de tinta) el BID otorgó no objeción al informe de Evaluación y recomendación de adjudicación en septiembre y s se notificó a las empresas. Se espera la entrega de los equipos en octubre.

El proceso de Adquisición de Equipamiento de Seguridad de Infraestructura (Firewall de Nueva Generación (NGFW), Firewall de Aplicaciones Web (WAF), Plataforma de Gestión y Análisis de Eventos

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

de Seguridad, bóveda de datos) para el CPD, se aprobó incrementar el presupuesto estimado pasando de $1.5 millones a $2.3 millones, se publicó el proceso; por lo tanto se espera que en el siguiente trimestre se presenten las ofertas y se llegue a solicitar no objeción al informe de recomendación de adjudicación.

Para el proceso Adquisición de equipamiento (Hardware y software) para el Centro de Control y Monitoreo (CCM), se realizó una segunda enmienda a la fecha de presentación de las ofertas, debido a un cambio en las especificaciones técnicas y se espera que el siguiente trimestre se reciban las ofertas.

Actividades administrativas y de gestión del Proyecto.

Durante el tercer trimestre de 2026, se avanzó en la gestión de la reformulación del proyecto y en este marco, el 25 de septiembre se solicitó a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), mediante Oficio, la primera enmienda a la Nota de Prioridad.

Asimismo, se realizó revisión técnica conjunta entre SEFIN y el BID, y una misión de análisis del Banco, durante las cuales se validaron la Teoría del Cambio, los indicadores y metas de la matriz de resultados y la estructura programática del Plan de Ejecución Plurianual (PEP).

También se ajustó el Plan Operativo Anual (POA) 2026 de US$7.22 millones a US$4.86 millones y se solicitó un desembolso de US$4.5 millones para septiembre, el cual fue recibido en la cuenta especial del proyecto. Adicionalmente, se solicitó la no objeción del BID al PEP actualizado, correspondiente a la nueva propuesta.

Finalmente, se avanzó en el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) mediante la contratación de su Coordinador General, quien asumiría funciones a partir del 1 de octubre de 2026, y se identificó la necesidad de incorporar personal especializado para fortalecer las áreas financiera, tecnológica, aduanera, de adquisiciones y de infraestructura socioambiental.

Para la vida del proyecto se han logrado alcanzar 13 hitos y 1 producto, según se detalla a continuación:

Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:
1.Propuesta de nueva Ley de Aduanas elaborada. 2.Estrategia de gestión de cambio interna y externa diseñada. 3.Estrategia para el fortalecimiento en la integridad y transparencia diseñada. 4.Publicación del llamado de Licitación Pública Internacional del proceso de ERP.	1.Términos de Referencia de Reingeniería de Procesos Aduaneros y Procedimientos operativos estandarizados. 2.Términos de Referencia del Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR). 3.Especificaciones técnicas de los escáneres y PIC elaboradas. 4.Adquisición de edificio PIC y CCM. 5.Especificaciones técnicas para el equipamiento del Laboratorio Aduanero elaboradas.	1.Especificaciones Técnicas del Sistemas informáticos SARAH y PECH. 2.Centro de Procesamiento de Datos (CPD) Equipado (Tegucigalpa). 3.Especificaciones Técnicas para la adecuación e integración para la mejora de la infraestructura tecnológica de las Aduanas y CCG. 4.Equipamiento ofimático para la Administración Aduanera adquirido.

Producto: Redes de comunicación mejoradas (equipamiento).

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

D.1.1. Principales Metas Físicas al III Trimestre 2026

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programa-ción	Ejecución	% Ejec	Programa-ción	Ejecución	% Ejec
0400 - Administración Aduanera de Honduras								
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera	1.1 Ley y Reglamento	Reglamento elaborado	0.50	0	0%	0	0	0%
	1.2 Estrategia de gestión del RH con enfoque de equidad de género y diversidad diseñada.	Estrategia	0.1	0	0%	0	0	0%
	1.5 Estrategia de gestión de cambio interna y externa implementado.	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%
	2.1 Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados implementada	Manual Operativo /Procedimientos	0.60	0	0%	0	0	0%
	3.1 Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados	Sistema	0.4	0	0%	0	0	0%
	3.4 Centro de Control y Monitoreo (CCM) con equipamiento adquirido	Modelo diseñado y edificio	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Nota importante: la Unidad Ejecutora planificó los avances de los entregables para el cuarto trimestre.

D.1.2. Evaluación Financiera al III Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
	BID 5694/BL-HO	US$	50,000,000	9/10/2023

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera		Lempiras	1,335,915,000	31/7/2027
	Presupuesto Aprobado	**Presupuesto Vigente**	**Ejecutado (Devengado)**	**% Ejecución**
III Trimestre 2026	261,270,015	261,270,015	67,253,688.3	25.7%
Acumulado 2026	261,270,015	261,270,015	112,001,515.6	42.9%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,335,915,000	1,335,915,000	272,370,089.4	20.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio Promedio al 30/09/2026 (BCH): L26.7183 por US$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2026

Para el periodo reportado se firmaron los siguientes contratos con fecha de finalización al 31de julio de 2026:

1. Enmienda #2 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/04-2026, LÍDER TECNOLÓGICO 2 DE LA UEP.
2. Enmienda #2 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/05-2026, ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).
3. Enmienda #2 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/06-2026, ESPECIALISTA FINANCIERO-CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).
4. Enmienda #2 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/07-2026, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).
5. Enmienda #2 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/08-2026, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS.
6. Orden de compra UEP-ADUANAS-5694-001-2026, Adquisición de impresoras multifuncional de oficina con la empresa Componentes el ORBE.
7. Orden de compra UEP-ADUANAS-5694-002-2026, Adquisición de impresoras multifuncional tipo tabloide con la empresa CASH Business.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre, se ha participado en la segunda revisión técnica en septiembre 2026 y participado en la socialización de la teoría del cambio de la reformulación del proyecto:

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL III TRIMESTRE 2026

La problemática identificada por la Unidad Ejecutora e identificada por la DGIP se encuentran los siguientes puntos torales:

- Se requiere avanzar en la regularización de los terrenos de Corinto y Las Manos, completar la documentación técnica del laboratorio aduanero y cumplir con los requisitos socioambientales para la modificación del proyecto.
- También es prioritario gestionar ante la SEFIN la aprobación de las 47 plazas comprometidas, actualizar el Reglamento Operativo del Proyecto conforme a los lineamientos del BID y mantener las reuniones semanales de seguimiento para identificar y atender oportunamente los obstáculos que afecten la ejecución física y financiera.

G. CONCLUSIONES

- La inversión pública presenta una ejecución acumulada inferior a los recursos programados, por lo que es necesario fortalecer la planificación financiera, agilizar los procesos administrativos y alinear el presupuesto con la capacidad real de ejecución.
- Los avances físico-financiero se concentran principalmente en consultorías y procesos de adquisición, mientras que las metas físicas del tercer trimestre no registran ejecución. Se requiere mejorar la articulación entre los productos contractuales, los indicadores físicos y el registro de resultados.
- La modificación del proyecto y las inversiones en infraestructura fronteriza dependen de completar trámites administrativos, regularizar terrenos y cumplir requisitos técnicos y socioambientales; asimismo, es necesario acelerar los procesos de contratación pendientes para cumplir las metas de 2026.
- Se requiere fortalecer la Unidad Ejecutora del Proyecto mediante la incorporación de personal especializado, la aprobación de las 47 plazas comprometidas y una mayor coordinación interinstitucional para garantizar la sostenibilidad de las inversiones.
- Se requiere mantener el monitoreo periódico de los avances físicos y financieros, actualizar los cronogramas y establecer medidas correctivas oportunas para reducir retrasos y mejorar la rendición de cuentas.
- En conclusión, la prioridad para el último trimestre de 2026 es transformar los avances administrativos y preparatorios en resultados físicos verificables, mediante una planificación articulada, una gestión eficiente de los recursos y un seguimiento sistemático de las metas del proyecto.

H. RECOMENDACIONES

Se requiere mantener el monitoreo periódico de los avances físicos y financieros, actualizar los cronogramas y establecer medidas correctivas oportunas para reducir retrasos y mejorar la rendición de cuentas.

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Nivel Inversión / Institución / Programa o Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
		Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
	1. Inversión Productiva	**-**	**261,270,015**	**261,270,015**	**-**	**261,270,015**	**261,270,015**	**-**	**59,964,386**	**59,964,386**	**23.0%**	**-**	**67,253,688**	**67,253,688**	**0**	**-**	**112,001,516**	**112,001,516**	**0**
1	**0400 - Administración Aduanera de Honduras**	**-**	**261,270,015**	**261,270,015**	**-**	**261,270,015**	**261,270,015**	**-**	**59,964,386**	**59,964,386**	**23.0%**	**-**	**67,253,688**	**67,253,688**	**25.7%**	**-**	**112,001,516**	**112,001,516**	**42.9%**
1	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA CONVENIO BID 5694/BL-HO	-	261,270,015	261,270,015	-	261,270,015	261,270,015	-	59,964,386	59,964,386	23.0%	-	67,253,688	67,253,688	25.7%	-	112,001,516	112,001,516	42.9%
	TOTAL - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA	**-**	**261,270,015**	**261,270,015**	**-**	**261,270,015**	**261,270,015**	**-**	**59,964,386**	**59,964,386**	**23.0%**	**-**	**67,253,688**	**67,253,688**	**25.7%**	**-**	**112,001,516**	**112,001,516**	**42.9%**
	2. Formación Bruta de Capital Fijo	**83,290,883**	**-**	**83,290,883**	**83,290,883**	**-**	**83,290,883**	**27,520**	**-**	**27,520**	**0.0%**	**27,520**	**-**	**27,520**	**0**	**29,322**	**-**	**29,322**	**0**
	0400 - Administración Aduanera de Honduras	**83,290,883**	**-**	**83,290,883**	**83,290,883**	**-**	**83,290,883**	**27,520**	**-**	**27,520**	**0.0%**	**27,520**	**-**	**27,520**	**0.0%**	**29,322**	**-**	**29,322**	**0.0%**
	ADMINISTRACIÓN ADUANERA	83,290,883	-	83,290,883	83,290,883	-	83,290,883	27,520	-	27,520	0.0%	27,520	-	27,520	0.0%	29,322	-	29,322	0.0%
	TOTAL - ADMINISTRACIÓN ADUANERA	**83,290,883**	**-**	**83,290,883**	**83,290,883**	**-**	**83,290,883**	**27,520**	**-**	**27,520**	**0.0%**	**27,520**	**-**	**27,520**	**0.0%**	**29,322**	**-**	**29,322**	**0.0%**
	Total general	**83,290,883**	**261,270,015**	**344,560,898**	**83,290,883**	**261,270,015**	**344,560,898**	**27,520**	**59,964,386**	**59,991,905**	**23%**	**27,520**	**67,253,688**	**67,281,208**	**19.5%**	**29,322**	**112,001,516**	**112,030,838**	**32.5%**

Nota: SIAFI, 30/09/2026

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN

ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0400 - Administración Aduanera de Honduras								
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera CONVENIO BID 5694/BL-HO	1.1 Ley y Reglamento	Reglamento elaborado	0.5	0	0%	0	0	0%
	1.2 Estrategia de gestión del RH con enfoque de equidad de género y diversidad diseñada.	Estrategia	0.1	0	0%	0	0	0%
	1.5 Estrategia de gestión de cambio interna y externa implementado.	Estrategia	1	0	0%	0	0	0%
	2.1 Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados implementada	Manual Operativo/Procedimientos	0.6	0	0%	0	0	0%
	3.1 Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados	Sistema	0.4	0	0%	0	0	0%
	3.4 Centro de Control y Monitoreo (CCM) con equipamiento adquirido	Modelo diseñado y edificio	1	0	0%	0	0	0%

***Nota*:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de septiembre de 2026

Nota importante: la Unidad Ejecutora planificó los avances de los entregables para el cuarto trimestre

AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL JAZMÍN, CENTRO HISTÓRICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELÉFONO (+504) 2222-8449
WWW.SEFIN.GOB.HN
