



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Informe No. 0513-001-2026

Tegucigalpa, Abril 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN.....	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) ...	4
D. PRINCIPALES PROYECTOS.....	5
D.1 Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.	5
D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026	5
D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026	7
D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026.....	7
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	8
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026	9
G. CONCLUSIONES.....	9
H. RECOMENDACIONES.....	10
ANEXO 1	11
ANEXO 2.....	12



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Nacional de Estadística (INE), es una entidad gubernamental encargada de coordinar y regular el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Fue fundado en el año 2000, el INE tiene como mandato recolectar, analizar y difundir datos estadísticos confiables que reflejen la realidad nacional, apoyando así la planificación y toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. Entre sus principales objetivos, el INE se enfoca en asegurar la calidad y accesibilidad de las estadísticas oficiales, promover una cultura estadística en la sociedad, optimizar recursos mediante la coordinación de actividades estadísticas y fomentar la capacitación e investigación en esta área.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	515,529,840.0
Inversión Productiva	510,408,559.0
Formación Bruta de Capital	5,121,281.0
Presupuesto Vigente	1,013,390,559.0
Inversión Productiva	1,010,408,559.0
Formación Bruta de Capital	2,982,000.0
Ejecutado Anual	2,648,323.0
Inversión Productiva	2,645,314.0
Formación Bruta de Capital	3,009.0
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	0.3%
Compromiso Aprobado	3,692,499.9
Inversión Productiva	3,689,490.9
Formación Bruta de Capital	3,009.0
% Compromiso (Compromiso I Trim-2026/Vigente)	0.4%

Nota: SIAFI, 31/03/2026

Al I trimestre del 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de L1,013.4 millones para la ejecución de programas y proyectos. La ejecución acumulada fue de L2.65 millones (0.3% del presupuesto vigente), conforme a la información presentada en el Cuadro No. 01. Es importante mencionar que el presupuesto vigente al 31 de marzo de 2026 corresponde al presupuesto prorrogado del ejercicio fiscal 2025 para su aplicación durante el ejercicio 2026.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


El Instituto Nacional de Estadística (INE) financia sus programas y proyectos principalmente a través de Recursos Propios, Crédito Externo y Donaciones Externas, siendo el Crédito Externo la principal fuente con L1,010.4 millones al primer trimestre de 2026, seguido de Recursos Propios con L0.7 millones y Donaciones Externas con L2.3 millones; estos recursos se orientan principalmente a la ejecución del Censo de Población y Vivienda y al fortalecimiento de la producción estadística nacional, lo que permite mejorar la generación de información oportuna y de calidad para la toma de decisiones en el país.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Gráfico No. 01
Instituto Nacional de Estadísticas:
Inversión por Fuente de Financiamiento
Cifras en millones de Lempiras

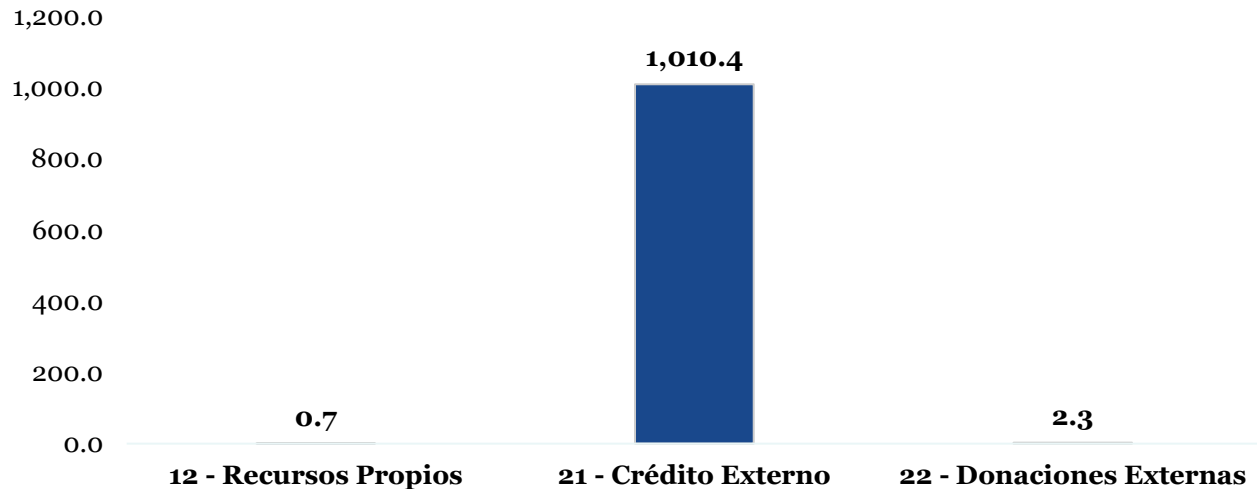

Fuente: SIAFI

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado de las inversiones del Instituto Nacional de Estadísticas al cierre del primer trimestre de los años 2022 a 2026:


- En 2022 y 2023, la institución mantuvo un presupuesto muy reducido (L798,000 en ambos años), con una ejecución prácticamente nula de 0% y 0.3%, respectivamente, reflejando una baja dinámica operativa. A partir de 2024 se observa un incremento significativo del presupuesto vigente a L163.9 millones, aunque con una ejecución baja de 0.02%, asociado al proceso de preparación de intervenciones estadísticas de mayor escala.
- En 2025, el presupuesto aumenta de forma importante a L373.7 millones, incorporando recursos para la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda y el fortalecimiento de la producción estadística nacional, alcanzando una ejecución de 0.5%, lo que evidencia el inicio de la fase operativa del proyecto.
- En 2026 el presupuesto vigente se eleva a L1,013.3 millones, también con asignación orientada al Censo y la producción estadística, registrando una ejecución de 0.26% al primer trimestre, lo que refleja la continuidad del despliegue operativo del levantamiento censal y el fortalecimiento institucional, aunque aún con retos en la ejecución oportuna de los recursos.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Gráfico No. 02
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 31 de marzo (2022-2026)
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas
Cifras en millones de Lempiras

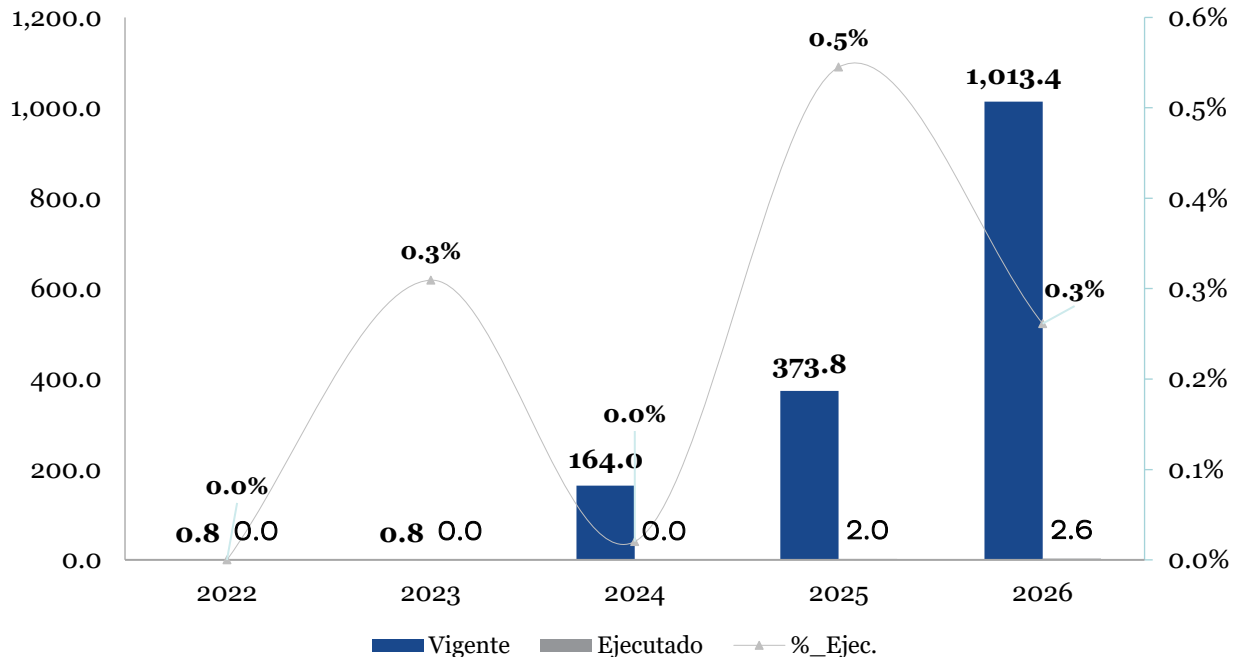

Fuente: SIAFI

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva al primer trimestre de 2026 se concentra en el siguiente proyecto:

D.1 Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.

El objetivo general de esta operación es de incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas, al cual contribuirán los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad; y (ii) fortalecer la institucionalidad del INE.

D.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registra avances financieros por L2.6 millones en el marco del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, reflejando el inicio de la ejecución de las



SECRETARÍA DE FINANZAS



actividades programadas para el presente ejercicio fiscal. En cuanto a los avances físicos, estos se concentran principalmente en la planificación operativa del levantamiento censal que se ejecutará en el año en curso, así como en la coordinación interinstitucional, preparación logística, depuración y organización de la cartografía y fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas del personal. Estas acciones corresponden a la fase previa y de alistamiento del operativo censal, sentando las bases para la ejecución del levantamiento en los siguientes meses del año.

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Program.	Ejecución	% Ejec	Program.	Ejecución	% Ejec
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas								
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	Instrumento de recolección de datos censales (boleta)	BOLETA	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda	CENSO	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	Prueba piloto experimental realizada	PRUEBA PILOTO	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Actualización cartográfica segmentación municipios	MUNICIPIOS	298	298	100.00%	298	298	100.00%
	Levantamiento del Censo Agropecuario Nacional (CAN)	MUNICIPIOS	143	128	89.5%	143	128	89.5%
	Análisis de datos censales	INFORME	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	Difusión de información de la población censada	INFORME	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	Evaluación postcensal	EVALUACIÓN	0	0	0.00%	0	0	0.00%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto.

Resumen de principales actividades realizadas en el trimestre

Componente I: Apoyo a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV). Durante el trimestre se completó la recepción final de equipo informático, periféricos y licencias de software para la Unidad Ejecutora del Programa, conforme a las órdenes de compra INE-CNPV-11-B-2025 e INE-CNPV-12-B-2025. Asimismo, se iniciaron procesos de adquisiciones para: (i) el servicio de re-etiquetado de equipo de campo y protección del personal; (ii) servicios de consultoría en comunicación estratégica para la elaboración y ejecución del plan de medios de la campaña del CNPV; (iii) la contratación de una plataforma tecnológica integral para el



SECRETARÍA DE FINANZAS



reclutamiento y selección de personal de campo; y (iv) la prestación de servicios bancarios para el pago de sueldos, viáticos y estipendios del personal censal.

Componente II: Apoyo al Sistema Integrado de Estadísticas Agropecuarias. Se contrató la consultoría individual de asistencia técnica para apoyar la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda y del Censo Agropecuario Nacional (CAN).

Componente III: Fortalecimiento técnico e institucional del INE. Se completó la recepción final de material promocional dirigido a productores de información (12 de enero de 2026), como parte de las acciones de fortalecimiento institucional y apoyo a la producción estadística.

Gestión, auditoría y evaluación. Se realizó la recontractación de especialistas y personal de apoyo de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), asegurando la continuidad operativa para la coordinación, seguimiento y gestión administrativa del proyecto.

D.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa de Modernización Integral y Profesionalización de los Servicios de la Policía Nacional de Honduras al primer trimestre de 2026:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	BID 5832/BL-HO	US\$	\$50,000,000	31/10/2024-28/05/2028
		Lempiras	L1,334,795,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	510,408,559	1,010,408,559	2,645,314	0.26%
Acumulado Vida del Proyecto*	1,334,795,000	1,334,795,000	182,899,513	13.7%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2026 (I Trimestre), el Programa reporta como principales adquisiciones: (i) la finalización de la recepción de equipo informático, periféricos y licencias de software para la Unidad Ejecutora (órdenes de compra INE-CNPV-11-B-2025 e INE-CNPV-12-B-2025), y (ii) el inicio de procesos de contratación para servicios clave de apoyo al operativo censal (re-etiquetado de equipo de campo y protección de personal; consultoría de comunicación estratégica para el plan de medios de la campaña censal; plataforma tecnológica



SECRETARÍA DE FINANZAS



para reclutamiento/selección de personal de campo; y servicios bancarios para pagos al personal del censo).

Cuadro No. 4
Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Componente / área	Proceso / adquisición	Monto referencial	Estado (enero-mar 2026)
Componente I (CNPV)	Adquisición de equipo informático, periféricos y licencias de software (Órdenes de compra INE-CNPV-11-B-2025 e INE-CNPV-12-B-2025).	L 3,909,508.09 y L 635,845.01	Recepción final: 13 y 27 de marzo de 2026.
Componente I (CNPV)	Servicio de re-etiquetado de equipo de campo y protección de personal para el levantamiento del CNPV.	US\$ 200,000.00	Proceso iniciado.
Componente I (CNPV)	Consultoría de comunicación estratégica para elaboración y ejecución del plan de medios de la campaña del CNPV.	US\$ 300,000.00	Proceso iniciado.
Componente I (CNPV)	Plataforma tecnológica integral para reclutamiento y selección del personal de campo del CNPV.	US\$ 100,000.00	Proceso iniciado.
Componente I (CNPV)	Contratación de servicios bancarios para pago de sueldos, viáticos y estipendios del personal del CNPV.	Pago por comisión por transferencia	Proceso iniciado.

Fuente: Informe de Progreso (Ejecución al 30 de marzo de 2026) del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, BID 5832/BL-HO.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el I Trimestre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), realizó gestiones orientadas a asegurar la implementación operativa y administrativa del Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (BID 5832/BL-HO).

Entre las principales gestiones se incluyen:

- Seguimiento a la planificación y programación de actividades mediante los instrumentos de gestión (POA, PEP y PACC), Cuotas de compromiso ante la SEFIN.
- Coordinación y preparación de procesos de contratación, incluyendo la elaboración/revisión de términos de referencia y especificaciones técnicas para servicios estratégicos del operativo censal;
- Gestión de adquisiciones y seguimiento de órdenes de compra para equipamiento informático y licencias, con énfasis en la recepción y conformidad de bienes;
- Coordinación institucional y técnica para la ejecución del CNPV y el CAN, y
- Fortalecimiento de la continuidad operativa del programa mediante la contratación de especialistas y personal de apoyo de la UEP, así como el seguimiento a registros y validaciones administrativas/financieras en los sistemas institucionales (SIAFI/UEPEX) para respaldar compromisos y pagos.



F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

Durante el I Trimestre de 2026, el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (BID 5832/BL-HO) enfrentó desafíos propios de la fase preparatoria del operativo censal y del escalamiento de procesos administrativos y de contratación, lo cual incidió en el ritmo de ejecución física y financiera. A continuación, se detallan las principales problemáticas identificadas y las acciones adoptadas:

- Programación y disponibilidad presupuestaria: al inicio del ejercicio fiscal se presentaron desafíos para sincronizar la programación operativa con la calendarización de cuotas/compromisos y los tiempos de trámite administrativo. **Acción:** ajuste de la planificación trimestral, priorización de actividades críticas y seguimiento interno a los requerimientos para habilitar compromisos y devengados y solicitud de incorporación adicional por un monto de L500.0 millones.
- Tiempos de contratación y secuenciación de procesos: varios servicios indispensables para el operativo (re-etiquetado de equipo de campo y protección de personal; comunicación estratégica; plataforma tecnológica de reclutamiento/selección; servicios bancarios) requieren etapas previas de preparación y evaluación. **Acción:** elaboración/visión de términos de referencia y especificaciones técnicas, definición de la ruta crítica de contratación y lanzamiento escalonado de procesos.
- Logística y alistamiento del operativo censal: la magnitud del CNPV demanda asegurar oportunamente insumos, equipamiento y procedimientos antes del despliegue de campo. **Acción:** seguimiento a la recepción y conformidad de bienes (equipo informático y licencias) y fortalecimiento de la coordinación logística para el alistamiento del operativo.
- Coordinación interinstitucional y articulación técnica: la ejecución del CNPV y el CAN requiere coordinación con actores internos y externos para consolidar insumos técnicos, roles y cronogramas. **Acción:** realización de sesiones de coordinación y definición de responsables y entregables por área, con seguimiento periódico.
- Capacidad operativa y continuidad del equipo ejecutor: la transición entre periodos contractuales y la alta carga de gestión en fase preparatoria puede afectar la continuidad y oportunidad de la ejecución. **Acción:** recontractación y consolidación del equipo de la UEP, con distribución de responsabilidades para seguimiento de adquisiciones, planificación y control administrativo/financiero.

G. CONCLUSIONES

- En el primer trimestre de 2026, el INE tuvo una ejecución financiera baja de L2.65 millones (0.26%) frente a un presupuesto de L1,013.4 millones, debido a que el proyecto está en fase de preparación del censo y de inicio de compras.
- Entre 2022 y 2026, el presupuesto del INE creció de forma fuerte a partir de 2024, llegando a más de L1,000 millones en 2026, por la ejecución del Censo de Población y Vivienda y el fortalecimiento del sistema estadístico.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- El programa de censo concentra la mayor inversión y ha avanzado en la preparación del operativo, como la actualización cartográfica, la prueba piloto y la boleta censal, dejando listas las bases técnicas para el levantamiento censal de campo.
- En la parte física, se cumplieron actividades de preparación importantes, aunque aún faltan etapas como el levantamiento completo, el procesamiento y la difusión de resultados.
- Las acciones administrativas y de gestión permitieron mantener el programa activo y preparar las condiciones para su ejecución en los siguientes trimestres.

H. RECOMENDACIONES

- Mejorar la relación entre la planificación del trabajo y la ejecución del presupuesto, para que el gasto siga el ritmo del operativo censal y las necesidades del proyecto.
- Dar prioridad a los procesos de compra y contratación relacionados con el Censo de Población y Vivienda, especialmente los servicios clave para el trabajo de campo, la logística, la tecnología y la comunicación.
- Fortalecer el seguimiento y control del avance físico y financiero, para mejorar la ejecución en cada trimestre y evitar que el gasto se concentre al final del año.
- Mantener la coordinación con la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y los cooperantes, para asegurar la entrega oportuna de recursos y el flujo adecuado de los desembolsos durante la ejecución del programa.
- Continuar fortaleciendo al equipo técnico y operativo del INE y de la Unidad Ejecutora, cuidando la estabilidad del personal y el manejo del conocimiento para asegurar el avance del censo en 2026.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	1. Inversión Productiva		-	510,408,559	510,408,559	-	1,010,408,559	1,010,408,559	-	2,645,314	2,645,314	0.26%
1	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas			510,408,559	510,408,559		1,010,408,559	1,010,408,559		2,645,314	2,645,314	0.26%
1	PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	5832/BL-HO		510,408,559	510,408,559		1,010,408,559	1,010,408,559		2,645,314	2,645,314	0.26%
	Total PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO			510,408,559	510,408,559		1,010,408,559	1,010,408,559		2,645,314	2,645,314	0.26%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		2,839,281	2,282,000	5,121,281	700,000	2,282,000	2,982,000	3,009	-	3,009	0.10%
	0513 - Instituto Nacional de Estadísticas		2,839,281	2,282,000	5,121,281	700,000	2,282,000	2,982,000	3,009	-	3,009	0.10%
	PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS		2,839,281	2,282,000	5,121,281	700,000	2,282,000	2,982,000	3,009	-	3,009	0.10%
	Total PRODUCCIONES ESTADÍSTICAS		2,839,281	2,282,000	5,121,281	700,000	2,282,000	2,982,000	3,009	-	3,009	0.10%
	Total general		2,839,281	512,690,559	515,529,840	700,000	1,012,690,559	1,013,390,559	3,009	2,645,314	2,648,323	0.26%

Nota: SIAFI, 31/03/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0513 - Instituto Nacional de Estadísticas								
Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional	Instrumento de recolección de datos censales (boleta)	BOLETA	1	1	100%	1	1	100%
	Levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda	CENSO	0	0	0%	0	0	0%
	Prueba piloto experimental realizada	PRUEBA PILOTO	1	1	100%	1	1	100%
	Actualización cartográfica segmentación municipios	MUNICIPIOS	298	298	100%	298	298	100%
	Levantamiento del Censo Agropecuario Nacional (CAN)	MUNICIPIOS	143	128	90%	143	128	90%
	Análisis de datos censales	INFORME	0	0	0%	0	0	0%
	Difusión de información de la población censada	INFORME	0	0	0%	0	0	0%
	Evaluación postcensal	EVALUACIÓN	0	0	0%	0	0	0%

Nota: Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 31 de marzo de 2026
