



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
Secretaría de Ciencia
Innovación y Tecnología
(SENACIT)

Informe No. 00515-001-2026
Tegucigalpa, abril 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) 5	5
D. PRINCIPALES PROYECTOS	6
D.1 El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) cuenta con el proyecto de inversión productiva siguiente:.....	6
1. "Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras".	6
El proyecto de IHCIETI No tuvo actividades físicas ejecutadas durante este período:	6
Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2026 son los siguientes:	6
D.1.1. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026	7
D.1.2. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026	7
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026	8
G. CONCLUSIONES	8
H. RECOMENDACIONES	9
ANEXO 1	10
ANEXO 2	¡Error! Marcador no definido.



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) despliega esfuerzos significativos en respaldo a la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Honduras. Sus actividades abarcan diversas áreas estratégicas; en segundo lugar, se destaca su labor en la armonización de relaciones, actuando como facilitador en la colaboración entre el gobierno, la academia y el sector privado. Esta sinergia es clave para impulsar iniciativas conjuntas que beneficien el desarrollo científico y tecnológico del país.

Además, el IHCIETI se involucra activamente en la mejora de políticas y programas relacionados con la ciencia y la tecnología, contribuyendo de manera directa al diseño e implementación de marcos normativos que estimulan la innovación y el progreso en estos campos. Asimismo, enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de capacidades humanas, promoviendo la formación y el fortalecimiento de competencias en el capital humano hondureño para enfrentar los retos y oportunidades del entorno tecnológico actual y futuro.

Al I trimestre, la institución dispuso de un presupuesto vigente de L 73.4 millones, de los cuales L 73.1 millones corresponden a inversión productiva y L 0.3 millones en formación bruta de capital, al I trimestre no se muestra ejecución del presupuesto asignado.

En el marco del PCM 04-2026, artículo 17, y en estricta aplicación de lo establecido en el artículo 98 reformado de la Ley General de la Administración Pública, se dispone la intervención de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En tal sentido, la Comisión Interventora será integrada mediante Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente de la República, en el cual se establecerán los plazos de vigencia de la intervención, así como los términos para la presentación de los informes correspondientes, ejerciendo para todos los efectos las atribuciones contenidas en el citado artículo 98. En consecuencia, durante el período informado no fue posible registrar avances físicos ni financieros en la ejecución del proyecto.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	73,406,231.0
Inversión Productiva	73,106,231.0
Formación Bruta de Capital	300,000.0
Presupuesto Vigente	73,406,231.0
Inversión Productiva	73,106,231.0
Formación Bruta de Capital	300,000.0
Ejecutado Anual	0.0
Inversión Productiva	0.0
Formación Bruta de Capital	0.0
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	0.0%
Compromiso Aprobado	0.0
Inversión Productiva	0.0
Formación Bruta de Capital	0.0
% Compromiso (Compromiso I Cuatrim-)	0.0%

Nota: SIAFI, 31/03/2026




SECRETARÍA DE FINANZAS



B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

De acuerdo con el financiamiento el presupuesto total de la institución; este es financiado con fondos del Tesoro Nacional, evidenciando que el 99% del presupuesto está destinado a la Inversión Productiva, lo que refleja una clara prioridad institucional y respecto a la Formación Bruta de Capital representa el 1% del presupuesto, sin embargo, no se ha ejecutado el presupuesto asignado, como se muestra en el Gráfico No. 01.

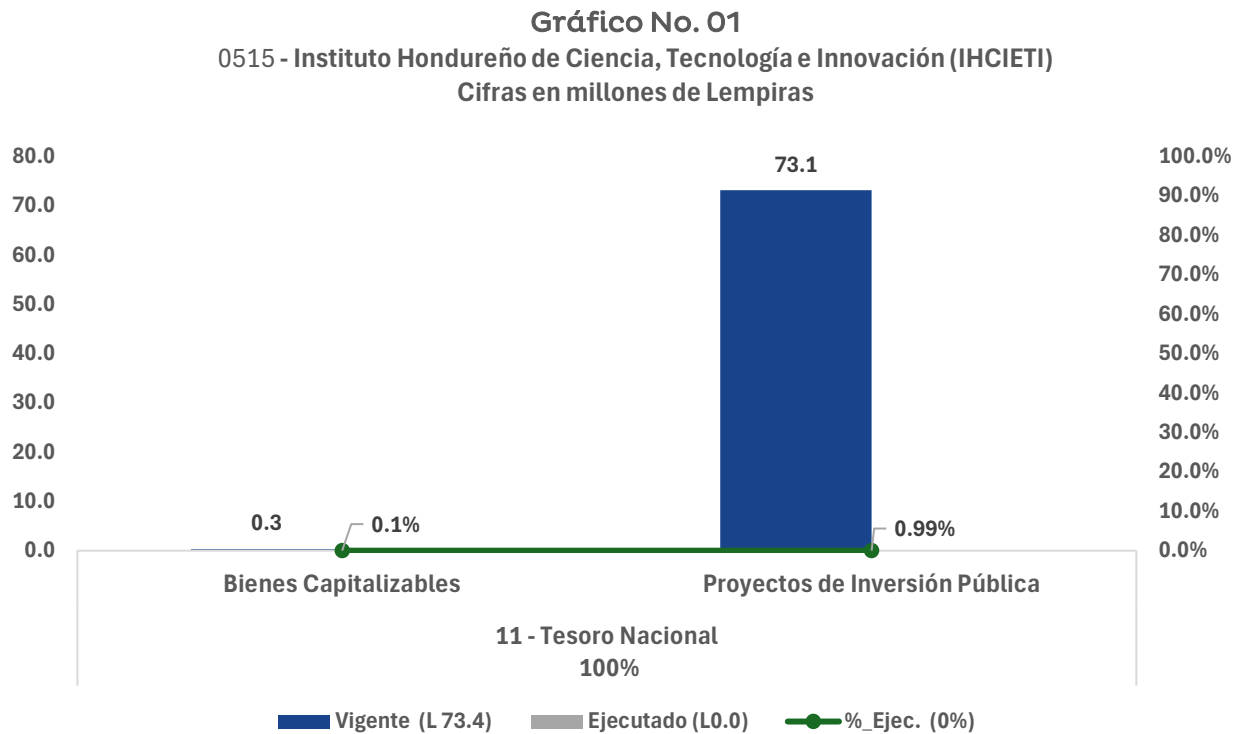

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS




C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

El comportamiento histórico de la ejecución al I trimestre (2022-2026) evidencia que, si bien la institución ha contado con asignaciones presupuestarias variables para inversión, la materialización del gasto durante el primer trimestre ha sido limitada y, en algunos años, nula. Este patrón sugiere una estacionalidad marcada de la ejecución (concentración en trimestres posteriores) y/o restricciones operativas al inicio de cada ejercicio fiscal, lo que incide en el ritmo de avance físico-financiero y en la capacidad de alcanzar metas anuales con oportunidad.

De acuerdo con el gráfico, la brecha entre el presupuesto vigente y el monto ejecutado al I trimestre se mantiene amplia a lo largo del período, reflejando una baja absorción temprana de recursos. En términos de gestión, esta diferencia representa recursos programados que no se convierten en bienes, obras o servicios durante el primer corte del año, incrementando la presión para ejecutar en los trimestres siguientes y elevando el riesgo de subejecución o de una ejecución acelerada que afecte la calidad y el control.

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2022 y 2026, basado en los montos vigentes y ejecutados:

Gráfico No. 2
Comportamiento de la Inversión Pública
0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)
Cifras en millones de Lempiras

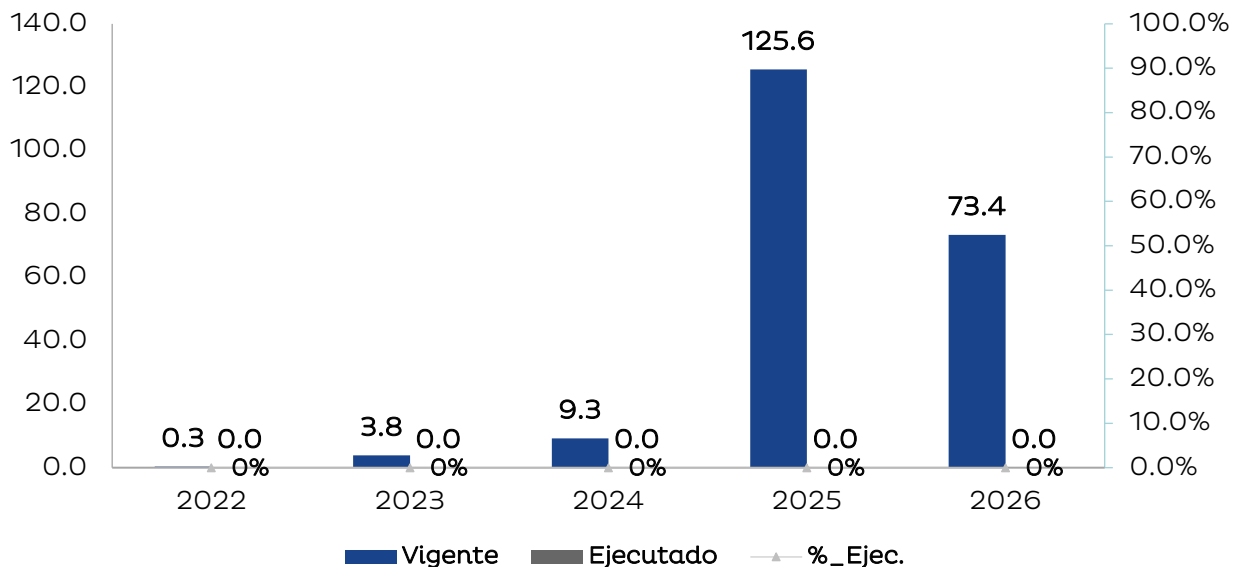

Fuente: SIAFI



D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI) cuenta con el proyecto de inversión productiva siguiente:

1. "Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras”.

El proyecto de IHCIETI No tuvo actividades físicas ejecutadas durante este período:

Las metas programadas para 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I trimestre de 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Capacitación de 540 personas en Ciencia Innovación y Tecnología	Personas	378	378	100%			0%
Planta Purificadora de Agua (botellones de Agua)	Galones	3,740	3,740	100%			0%
Elaboración de suministros de Bioseguridad Alcohol, Cloro, jabón Asisitín	Galones	3,231	3,231	100%			0%
Elaborado y entregado 150 prótesis de miembro superior y 5 prótesis de miembro inferior	Prótesis	75	75	100%			0%
Georreferenciando y reforestando 100 hectáreas de bosque a través de los drones	Hectáreas	50	50	100%			0%
Adquiridos entregados y 600 equipos tecnológicos ensamblados	Equipo	104	104	100%			0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

La ausencia de avances físicos y financieros durante el I Trimestre de 2026 obedece a la falta de asignación y disponibilidad presupuestaria, al retraso en la aprobación de la reformulación presupuestaria y a limitaciones institucionales que impidieron la ejecución de actividades, contrataciones y procesos de adquisición.”



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.1. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Evaluación Financiera I trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento de la Capacidad De SENACIT/IHCIETI para Brindar Servicios Integrados de Innovación Tecnológicas a la Población de Honduras	FN-25706-1	\$ 230,163,200	L 198,343,787	20/09/2024 20/09/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	73,106,231.00	73,106,231.00	0.0	0%
Acumulado 2026	73,106,231.00	73,106,231.00	0.0	0%
Acumulado Vida del Proyecto *	198,343,787	198,343,787	114,413,065	91.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/5/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

D.1.2. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Durante el I Trimestre de 2026 no se registraron adquisiciones relevantes en el proyecto, ya que no se realizaron procesos de consultoría, compras menores, licitaciones privadas, licitaciones públicas ni concursos, en consonancia con la falta de disponibilidad presupuestaria durante el período.

Fuente FHIS

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Revisión técnica y actualización de productos e instrumentos del POA 2026, priorizando actividades críticas para su reactivación una vez se cuente con disponibilidad presupuestaria.
- Gestiones internas para acompañar el proceso de reformulación y aprobación presupuestaria, a fin de garantizar el marco habilitante para la ejecución.

Durante el I Trimestre de 2026, el proyecto no contó con personal plenamente habilitado para su ejecución operativa, en virtud de las limitaciones administrativas, presupuestarias e institucionales que incidieron en el desarrollo normal de las actividades programadas.

Las acciones descritas permitieron mantener la operatividad mínima del proyecto y dejar condiciones preparatorias para reanudar la ejecución física y financiera en los trimestres siguientes, en función de la disponibilidad presupuestaria y la normalización de los procesos institucionales.



F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

Durante el I Trimestre de 2026, la ejecución del proyecto se vio afectada por factores administrativos y financieros que limitaron el desarrollo de las actividades programadas en el POA. A continuación, se detallan las principales problemáticas identificadas y las acciones de mitigación y gestión realizadas durante el período.

Problemáticas identificadas

- Ausencia de asignación y disponibilidad presupuestaria durante el trimestre, lo que impidió contraer compromisos y ejecutar actividades (conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto, Art. 50).
- Retraso en la reformulación y aprobación del presupuesto institucional, generando una pausa operativa en los procesos de compras, contrataciones y consultorías.
- Limitaciones institucionales para la coordinación y seguimiento, asociadas a cambios/ausencia temporal de autoridad superior y a la necesidad de fortalecer la gestión interna.
- Insuficiencia de espacio físico e infraestructura adecuada para instalar equipamiento, operar talleres/laboratorios y desarrollar procesos técnicos contemplados en el proyecto.
- Dependencia de transferencias corrientes y de capital que no fueron recibidas durante el período, afectando la liquidez necesaria para la ejecución.

G. CONCLUSIONES

- Durante el I Trimestre de 2026 no se registró ejecución física ni avance en procesos de compras, contrataciones o consultorías, principalmente por la falta de asignación y disponibilidad presupuestaria.
- La reformulación y aprobación tardía del presupuesto institucional, así como la ausencia de transferencias, impactaron la continuidad operativa del proyecto y limitaron la posibilidad de asumir compromisos.
- Persisten limitaciones institucionales y logísticas (autoridad, coordinación y disponibilidad de espacio físico) que deben atenderse para asegurar la ejecución eficiente de los componentes del proyecto.
- A pesar de la no ejecución, se realizaron acciones técnicas y administrativas de preparación (revisión del POA y levantamiento de requerimientos) que facilitan la reactivación en los trimestres siguientes.



H. RECOMENDACIONES

- Asegurar la disponibilidad presupuestaria y financiera oportuna para el proyecto, priorizando la programación de transferencias y la calendarización de compromisos para los próximos trimestres.
- Definir y formalizar un plan de reactivación del POA 2026 con metas trimestrales realistas, responsables, cronograma y ruta crítica para compras, contrataciones y ejecución física.
- Fortalecer la coordinación interna y los mecanismos de seguimiento (reuniones periódicas, matriz de control e indicadores), para reducir riesgos de retraso y mejorar la rendición de cuentas.
- Gestionar soluciones para la disponibilidad de espacios e infraestructura (adecuación, arrendamiento o convenios interinstitucionales), garantizando condiciones mínimas para instalar equipos y operar talleres/laboratorios.
- Preparar con anticipación los términos de referencia, especificaciones técnicas y documentación de soporte, de manera que al contar con fondos se inicien de inmediato los procesos de adquisición y contratación.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	12 - Recursos Promios	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejec	Total Fondos Nacionales	Total Fondos	Total general	% Comp./Vig
79	1. Inversión Productiva		73,106,231	-	73,106,231	-	73,106,231	-	73,106,231	-	-	-	12.2%	-	-	-	0.0%
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		73,106,231		73,106,231		73,106,231		73,106,231	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT/IHCIETI PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRADOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE HONDURAS	FN-25706-1	73,106,231		73,106,231		73,106,231		73,106,231	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SENACIT/IHCIETI PARA BRINDAR SERV		73,106,231		73,106,231		73,106,231		73,106,231	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		300,000		300,000	-	300,000		300,000	-	-	-	9.8%	-	-	-	0.0%
	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		300,000		300,000		300,000		300,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		300,000		300,000		300,000		300,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		300,000		300,000		300,000		300,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total general		73,406,231	-	73,406,231	-	73,406,231	-	73,406,231	-	-	-	0	-	-	-	0.0%

Nota: SIAFI, 30/04/2026
